

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
R.02.010.050 .C	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio da 151 mm a 200 mm	6	07/01/2013	15/01/2013						11'723,57	
U.05.010.060 .A	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo	2	17/01/2013	18/01/2013						2'316,49	
E.01.020.010 .A	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³ /4)	3	21/01/2013	23/01/2013						3'638,10	
E.01.020.020 .A	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³ /4)	1	23/01/2013	23/01/2013						78,12	
U.02.040.020 .E	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m ² . Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m ² DN 500 mm e d im/min 418 mm	6	23/01/2013	30/01/2013						17'221,37	

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
U.04.010.010 .A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	1	31/01/2013	31/01/2013						4'588,27	
E.03.010.010 .A	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³	2	01/02/2013	02/02/2013						3'309,97	
U.05.020.180 .A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA TM , confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA TM , compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	1	04/02/2013	04/02/2013						3'436,27	
U.05.020.190 .A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	1	05/02/2013	05/02/2013						1'779,50	
R.01.020.080 .A	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la	1	06/02/2013	06/02/2013						3'504,36	
U.04.020.070 .I	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x90 cm	1	07/02/2013	07/02/2013						2'341,04	
U.04.020.080 .Q	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x100 cm	1	08/02/2013	08/02/2013						3'600,80	
U.04.020.120 .E	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 150x150 cm	1	11/02/2013	11/02/2013						1'861,68	
U.04.020.250 .A	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale	1	12/02/2013	12/02/2013						1'670,40	
E.19.010.070 .A	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate fisse semplici	1	13/02/2013	13/02/2013						532,40	
R.02.010.050 .C	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio da 151 mm a 200 mm	1	14/02/2013	14/02/2013						1'704,31	
U.05.010.050 .A	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso	1	15/02/2013	15/02/2013						1'000,83	
U.05.010.060 .A	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo	1	18/02/2013	18/02/2013						1'385,82	
E.01.020.010 .A	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ² %)	13	19/02/2013	08/03/2013						18'584,48	
E.01.020.020 .A	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³ /4)	13	19/02/2013	08/03/2013						1'442,31	
E.03.030.010 .A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione	2	11/03/2013	12/03/2013						1'212,22	
E.03.040.020 .A	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,	2	13/03/2013	14/03/2013						3'418,33	
E.03.010.020 .B	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm ²	8	15/03/2013	27/03/2013						26'310,05	
U.04.020.250 .A	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale	1	19/03/2013	19/03/2013						417,60	

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
U.04.010.010 .A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	1	28/03/2013	28/03/2013						2'548,92	
1.1	Impianto di accumulo acque di Prima Pioggia, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in cav, con classe di resistenza C35/45 e classe di esposizione XC4 e XD3, a base quadrata o rettangolare, verificate per carichi stradali ed azioni sismiche secondo il DM 14/1/2008. Completo di: accumulo e dissabbiatura della acque di prima pioggia, pozzetto di bypass prefabbricato in cav, innesti di collegamento in pv, solette di copertura prefabbricate in cav con ispezioni a passo d'uomo e chiusini in ghisa di idonea classe. Le cisterne sono equipaggiate all'interno con sensore di pioggia, valvola antiriflusso (a richiesta), elettropompa sommergibile trifase di sollevamento acque stoccate, regolatore di livello a galleggiante, quadro elettrico di comando a programmazione logica controllata (PLC). L'impianto dovrà essere dimensionato con riferimento alla Legge Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (B.U.R. Calabria 9 ottobre 1997, n. 102.), al Piano di Tutela delle Acque Regionali pubblicato sul BURL n°4 del 10/12/2007 suppl. n°3, secondo la legge della regione Lombardia n°26 del 12/12/2003 art. 52 comma 1° (BURL n° 13 dei 28 marzo 2006, 1° suppl. ord.), e del Piano di tutela delle acque regione Lazio (BURE n° 34 del 10/12/2007) e nel rispetto del D.Lgs n. 152 del 3/4/2006. Il tutto compreso di impianto di separazione idrocarburi di origine minerale (classe 1), realizzato con cisterne monolitiche a base circolare prefabbricate in cav con classe di resistenza C35/45 e classe di esposizione XC4 e XD3, verificate per carichi stradali ed azioni sismiche secondo il DM 14/1/2008, completo di solette di copertura prefabbricate in cav pedonali o carrabili, predisposte per ispezioni a passo d'uomo e chiusini in ghisa di										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	idonea classe. Le cisterne sono equipaggiate con filtro a coalescenza rigenerabile, otturatore di sicurezza a galleggiante. L'impianto è dimensionato e costruito secondo quanto indicato nel D.Lgs n°152 del 3/4/2006 art. 113 parte III, prodotto, controllato e certificato a norma UNI EN 858 e dotato di marcatura CE. L'impianto è idoneo al trattamento delle acque meteoriche contenenti idrocarburi di origine minerale. L'impianto dovrà costruito da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008 certificato ICMQ. Nel prezzo sono compresi, oltre alla fornitura come sopra descritta, i calcoli statici dei soli manufatti prefabbricati, la certificazione e dichiarazione di conformità del quadro elettrico, la certificazione e dichiarazione di conformità dei manufatti prefabbricati., lo scarico dagli automezzi, l'uso del maniglione per movimentazione e scarico, il collocamento in opera, l'innesto delle tubazioni in entrata e uscita, il collegamento ed alimentazione corrente elettrica al quadro elettrico, il vano alloggiamento pompe e il quadro elettrico. Il tutto per una superficie complessiva di 304'000 m ² .	6	29/03/2013	05/04/2013						501'000,00	
U.04.020.080.Q	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x100 cm	3	08/04/2013	10/04/2013						14'853,30	
U.04.020.080.T	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x25 cm	3	08/04/2013	10/04/2013						4'039,68	
U.04.020.250 .A	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale	8	11/04/2013	23/04/2013						7'308,00	
R.01.020.080 .A	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la	7	24/04/2013	07/05/2013						11'559,36	
U.05.020.150 .A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale	1	08/05/2013	08/05/2013						3'613,79	
U.05.020.180 .A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdâ€™A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdâ€™A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	1	08/05/2013	08/05/2013						5'116,86	
U.05.020.190 .A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	1	08/05/2013	08/05/2013						2'649,80	
R.02.010.050 .C	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio da 151 mm a 200 mm	6	09/05/2013	16/05/2013						10'854,76	
U.05.010.050 .A	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso	1	17/05/2013	17/05/2013						548,33	
U.05.010.060 .A	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo	1	20/05/2013	20/05/2013						759,25	
E.01.020.010 .A	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³ /m ³)	2	21/05/2013	22/05/2013						2'125,72	
E.01.020.020 .A	Sovraprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³ /m ³)	1	23/05/2013	23/05/2013						,42	
U.01.030.120 .I	Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	2	24/05/2013	25/05/2013						19'780,40	
U.04.010.010 .A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	1	27/05/2013	27/05/2013						4'086,60	
E.03.010.010 .A	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m ³	1	28/05/2013	28/05/2013						2'960,94	
R.01.020.080 .A	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la	1	29/05/2013	29/05/2013						1'721,45	
U.05.020.180 .A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSD TM A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSD TM A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	1	30/05/2013	30/05/2013						2'803,39	
U.05.020.190 .A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	1	31/05/2013	31/05/2013						1'451,74	
U.04.020.070 .I	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x90 cm	1	03/06/2013	03/06/2013						292,63	
U.04.020.080 .Q	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x100 cm	1	04/06/2013	04/06/2013						225,05	
U.04.020.080.S	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x50 cm	1	04/06/2013	04/06/2013						156,23	
U.04.020.120.E	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 150x150 cm	1	04/06/2013	04/06/2013						232,71	
U.04.020.250.A	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale	1	04/06/2013	04/06/2013						208,80	
U.01.050.020.F	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta,										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN125	1	05/06/2013	05/06/2013						1'263,36	
C.09.010.010.A	Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco UNI 70 VV.F., fornito in opera completo di: a) valvola di intercettazione in ottone UNI 5705; b) valvola di non ritorno in ottone UNI 5705; c) valvola di sicurezza in ottone UNI 5705; d) valvola di intercettazione con attacco UNI 70 VV.F. Montato compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto di alimentazione da 4"	1	06/06/2013	06/06/2013						1'103,61	
C.09.010.070.B	Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar, fornito in opera composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone; c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70; d) guarnizioni di tenuta O-RING e serraggio in gomma telata; e) curva di raccordo; f) flange in AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo scavo, al rinterro e al materiale drenante ma sono compresi tutti gli oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte cad Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70	9	07/06/2013	20/06/2013						16'902,87	
1.2	Verifica e revisione della rete antincendio e della rete idrica con l'utilizzo di un localizzatore di sottoservizi e perdite, compreso il controllo della tenuta della pressione, la pressurizzazione delle reti, la riparazione delle zone ammalorate o mal funzionanti, compresa la sostituzione e/o integrazione degli elementi necessari a parere della Direzione dei Lavori, l'eventuale sostituzione di parti delle tubazioni e dei pezzi speciali mal funzionanti. Sono altresì compresi tutti i pezzi speciali necessari per i nuovi allacci alle										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	utenze alla rete idrica e degli idranti alla rete antincendio e tutte le opere complementari necessarie per il ripristino delle reti quali scavi, rinterrì, demolizioni, tagli, saldature e quanto altro necessario per dare le reti funzionanti a perfetta regola d'arte ed in tutte le loro parti.	4	21/06/2013	26/06/2013						10'000,00	
U.01.050.020 .F	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN125	1	27/06/2013	27/06/2013						631,68	
1.3	Rimozione e ripristino di elementi in calcestruzzo tipo solette, delle dimensioni di 90x60 cm, spessore medio da 10 cm e fino a 24 cm, da riporre con malta o su sabbia, compreso recupero del materiale nei luoghi indicati dal committente, fino ad una distanza massima di 1 km. Eseguita a mano o con mezzi meccanici ma con particolare cura.	12	28/06/2013	16/07/2013						14'335,81	
R.02.010.050 .C	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio da 151 mm a 200 mm	2	17/07/2013	18/07/2013						3'926,42	
E.03.010.030 .B	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm ³	3	17/07/2013	19/07/2013						3'679,87	
E.01.020.010 .A	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³ /4)	2	19/07/2013	20/07/2013						2'357,93	
E.01.020.020 .A	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³ /4)	2	19/07/2013	20/07/2013						76,92	
E.03.010.020 .B	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm ³	3	22/07/2013	24/07/2013						8'724,90	
E.03.030.010 .B	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione	7	22/07/2013	31/07/2013						6'504,92	
E.03.040.020 .A	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,	2	25/07/2013	26/07/2013						2'919,41	
M.05.010.06 0.H	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 4 diametro mm 2010	2	29/07/2013	30/07/2013						42'989,88	
U.01.030.120 .H	Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggotamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	10,0 mm	1	31/07/2013	31/07/2013						340,41	
U.01.030.120 .E	Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1	01/08/2013	01/08/2013						480,32	
U.01.050.020 .E	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN100	1	02/08/2013	02/08/2013						749,67	
I.02.010.070. G	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 2"	1	05/08/2013	05/08/2013						279,36	
C.04.020.080 .Z9	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, in opera. Sono comprese:										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/80/160 H = 3,60/3,30/2,50 DN = mm 80	1	06/08/2013	06/08/2013						17'659,20	
C.04.020.110 .E	Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono comprese: valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse: coibentazioni ed isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati secondo norma UNI PN16 Montaggio gemellare di motopompe singole dimensionate DN80	1	07/08/2013	07/08/2013						6'364,05	
E.03.010.010 .A	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³	1	08/08/2013	08/08/2013						2'169,03	
U.05.020.180 .A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdâ€™™A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinatrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdâ€™™A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	1	09/08/2013	09/08/2013						2'053,63	
U.05.020.190 .A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	1	12/08/2013	12/08/2013						1'063,49	
U.04.020.250 .A	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale	3	13/08/2013	16/08/2013						1'252,80	
U.05.010.050 .A	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso	1	16/08/2013	16/08/2013						85,44	
U.05.010.060 .A	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo	1	19/08/2013	19/08/2013						118,30	
L.02.040.130 .D	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75	1	20/08/2013	20/08/2013						279,50	
L.02.010.170 .G	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Quadripolare Sezione 4x25 mm ²	1	21/08/2013	21/08/2013						2'275,65	
L.05.010.010 .D	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo sezione nominale 35 mm ²	1	22/08/2013	22/08/2013						81,30	
L.05.020.010 .A	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 1,5 m	1	22/08/2013	22/08/2013						253,77	
U.04.020.010 .B	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm	1	23/08/2013	23/08/2013						90,66	
U.04.020.040 .A	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Normale 30x30 cm	1	23/08/2013	23/08/2013						27,33	
1.4	Fornitura, trasporto e posa in opera di un Quadro elettrico, composto da: 1) Quadro modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a parete mm										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	<p>300x550x90; 2) Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 60 kA; 3) N° 1 interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A bipolare, da 30 A a 50 A; 4) Morsettiera di potenza con piede in plastica per barra o capocorda: sezione nominale 35 mm 5) n° 1 di morsetti con corpo in plastica e collegamento a vite. A 2 collegamenti, per barra DIN: sezione nominale 25 mm 6) n° 5 di morsetti con corpo in plastica e collegamento a vite. A 2 collegamenti, per barra DIN: sezione nominale 6,0 mm 7) n° 2 di morsetti con corpo in plastica e collegamento a vite. A 2 collegamenti, per barra DIN: sezione nominale 4,0 mm 8) Fornitura e posa in opera di n° 1 centralino da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35. Centralino da parete in resina da 36 moduli mm 266x516x132; 9) n° 3 interruttori automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA -Potere di interruzione differenziale: 6 kA -Corrente nominale differenziale: 0,03 A -Corrente di guasto alternata -Caratteristica di intervento magnetico C -Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3 -Grado di protezione sui morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A Compreso opere murarie, cablaggio, collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	1	26/08/2013	26/08/2013						928,54	

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
R.01.020.080 .A	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la	1	27/08/2013	27/08/2013						1'793,56	
R.02.010.050 .C	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio da 151 mm a 200 mm	1	28/08/2013	28/08/2013						2'510,93	
E.01.020.010 .A	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³ /4)	1	29/08/2013	29/08/2013						890,79	
E.01.020.020 .A	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³ /4)	1	29/08/2013	29/08/2013						25,64	
E.03.030.010 .B	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione	3	30/08/2013	04/09/2013						2'241,75	
E.03.010.020 .B	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm ³	2	05/09/2013	06/09/2013						2'908,30	
E.03.010.030 .B	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm ³	2	09/09/2013	10/09/2013						1'226,98	
E.03.040.020 .A	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,	1	11/09/2013	11/09/2013						973,14	
M.05.010.06 0.H	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 4 diametro mm 2010	1	12/09/2013	12/09/2013						14'329,96	
U.01.030.120 .H	Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	1	13/09/2013	13/09/2013						113,47	
U.01.030.120 .E	Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1	16/09/2013	16/09/2013						160,11	
U.01.050.020 .E	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta,										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN100	1	17/09/2013	17/09/2013						249,89	
I.02.010.070.G	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 2"	1	18/09/2013	18/09/2013						93,12	
C.04.020.080.Z9	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, in opera. Sono comprese: controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/80/160 H = 3,60/3,30/2,50 DN = mm 80	1	20/09/2013	20/09/2013						5'886,40	
C.04.020.110.E	Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono comprese: valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse: coibentazioni ed isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati secondo norma UNI PN16 Montaggio gemellare di motopompe singole dimensionate DN80	1	23/09/2013	23/09/2013						2'121,35	
U.05.010.050.A	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso	1	24/09/2013	24/09/2013						85,44	
U.05.010.060 .A	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo	1	25/09/2013	25/09/2013						118,30	
L.02.040.130 .D	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75	1	26/09/2013	26/09/2013						279,50	
L.02.010.170 .G	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Quadripolare Sezione 4x25 mm²	1	27/09/2013	27/09/2013						758,55	
L.05.010.010 .D	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo sezione nominale 35 mm²	1	30/09/2013	30/09/2013						27,10	
L.05.020.010 .A	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 1,5 m	1	01/10/2013	01/10/2013						84,59	

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
U.04.020.010 .B	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm	1	02/10/2013	02/10/2013						30,22	
U.04.020.040 .A	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Normale 30x30 cm	1	02/10/2013	02/10/2013						9,11	
1.4	Fornitura, trasporto e posa in opera di un Quadro elettrico, composto da: 1) Quadro modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a parete mm 300x550x90; 2) Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 60 kA; 3) N° 1 interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A bipolare, da 30 A a 50 A; 4) Morsettiera di potenza con piede in plastica per barra o capocorda: sezione nominale 35 mm 5) n° 1 di morsetti con corpo in plastica e collegamento a vite. A 2 collegamenti, per barra DIN: sezione nominale 25 mm 6) n° 5 di morsetti con corpo in plastica e collegamento a vite. A 2 collegamenti, per barra DIN: sezione nominale 6,0 mm 7) n° 2 di morsetti con corpo in plastica e collegamento a vite. A 2 collegamenti, per barra DIN: sezione nominale 4,0 mm 8) Fornitura e posa in opera di n° 1 centralino da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	guida DIN 35. Centralino da parete in resina da 36 moduli mm 266x516x132; 9) n° 3 interruttori automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA -Potere di interruzione differenziale: 6 kA -Corrente nominale differenziale: 0,03 A -Corrente di guasto alternata -Caratteristica di intervento magnetico C -Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3 -Grado di protezione sui morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10+32 A; 2m; A Compreso opere murarie, cablaggio, collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	1	03/10/2013	03/10/2013						928,54	
U.05.020.180 .A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSDA TM A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSDA TM A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	1	04/10/2013	04/10/2013						975,74	
U.05.020.190 .A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	1	07/10/2013	07/10/2013						505,30	
E.03.010.010 .A	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³	1	08/10/2013	08/10/2013						1'030,57	
R.01.020.080 .A	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la	1	09/10/2013	09/10/2013						713,75	
U.01.030.120 .G	Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	4	10/10/2013	16/10/2013						2'854,46	
U.01.050.020 .D	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN80	1	17/10/2013	17/10/2013						437,84	
U.01.050.020 .A	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN40	1	18/10/2013	18/10/2013						1'014,58	
1.3	Rimozione e ripristino di elementi in calcestruzzo tipo solette, delle dimensioni di 90x60 cm, spessore medio da 10 cm e fino a 24 cm, da riporre con malta o su sabbia, compreso recupero del materiale nei luoghi indicati dal committente, fino ad una distanza massima di 1 km. Eseguita a mano o con mezzi meccanici ma con particolare cura.	6	21/10/2013	29/10/2013						3'749,60	
R.02.010.050 .C	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio da 151 mm a 200 mm	1	24/10/2013	24/10/2013						279,06	
U.05.010.050 .A	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	bituminoso	1	29/10/2013	29/10/2013						42,39	
U.05.010.060 .A	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo	1	30/10/2013	30/10/2013						58,70	
E.01.020.010 .A	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ² %)	2	31/10/2013	01/11/2013						139,71	
U.01.030.120 .G	Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1	04/11/2013	04/11/2013						257,79	
U.04.010.010 .A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	1	05/11/2013	05/11/2013						315,92	
E.03.010.010 .A	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³	1	05/11/2013	05/11/2013						228,90	
U.05.020.180 .A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSDâ€™™A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSDâ€™™A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	1	06/11/2013	06/11/2013						216,72	
U.05.020.190 .A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	1	07/11/2013	07/11/2013						112,23	
R.01.020.080 .A	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la	1	08/11/2013	08/11/2013						102,03	
U.04.020.070 .I	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x90 cm	1	11/11/2013	11/11/2013						292,63	
U.04.020.080 .T	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x25 cm	1	12/11/2013	12/11/2013						126,24	
U.04.020.120 .E	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 150x150 cm	1	13/11/2013	13/11/2013						232,71	
U.04.020.250 .A	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale	1	14/11/2013	14/11/2013						208,80	
E.19.010.070 .A	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate fisse semplici	1	15/11/2013	15/11/2013						36,97	

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
R.02.010.050 .C	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio da 151 mm a 200 mm	1	18/11/2013	18/11/2013						1'429,80	
U.05.010.050 .A	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso	1	19/11/2013	19/11/2013						108,34	
U.05.010.060 .A	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo	1	20/11/2013	20/11/2013						150,01	
E.01.020.010 .A	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ² %)	2	21/11/2013	22/11/2013						396,56	
U.01.030.120 .G	Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	5	25/11/2013	29/11/2013						658,85	
U.04.010.010 .A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfiando di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	3	02/12/2013	04/12/2013						807,44	
E.03.010.010 .A	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m ³	1	05/12/2013	05/12/2013						585,02	
U.05.020.180 .A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSDA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSDA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	2	06/12/2013	07/12/2013						553,90	
U.05.020.190 .A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CSDA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CSDA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	2	09/12/2013	10/12/2013						286,84	
R.01.020.080 .A	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle										

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la	2	12/12/2013	13/12/2013						338,89	
U.04.020.070 .I	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x90 cm	3	16/12/2013	18/12/2013						292,63	
U.04.020.080 .T	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x25 cm	2	19/12/2013	20/12/2013						126,24	
U.04.020.120 .E	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 150x150 cm	2	23/12/2013	24/12/2013						232,71	
U.04.020.250 .A	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie										


Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
	in ghisa sferoidale	2	27/12/2013	28/12/2013						208,80	
E.19.010.070 .A	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate fisse semplici	2	30/12/2013	31/12/2013						36,97	
U.01.050.020 .D	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN80	3	02/01/2014	08/01/2014						218,92	
U.05.010.050 .A	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso	1	16/01/2014	16/01/2014						1'672,95	


Mese	Febbraio 2013														Marzo 2013																							
Giorno	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	0,53	1,70	1,00	0,00	0,00	1,38	1,54	1,54	1,54	1,54	0,00	0,00	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	0,00	0,00	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	0,00	0,00	0,60	0,60	1,70	1,70	3,28	0,00	0,00	3,28	3,70	3,28	3,28	
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	61,9	63,6	64,6	64,6	64,6	65,9	67,5	69,0	70,6	72,1	72,1	72,1	73,6	75,2	76,7	78,3	79,8	79,8	79,8	81,4	82,9	84,4	86,0	87,5	87,5	88,1	88,7	90,4	92,1	95,4	95,4	95,4	98,7	102,4	105,7	109,0	109,0	
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SP1


RETE ACQUE BIANCHE

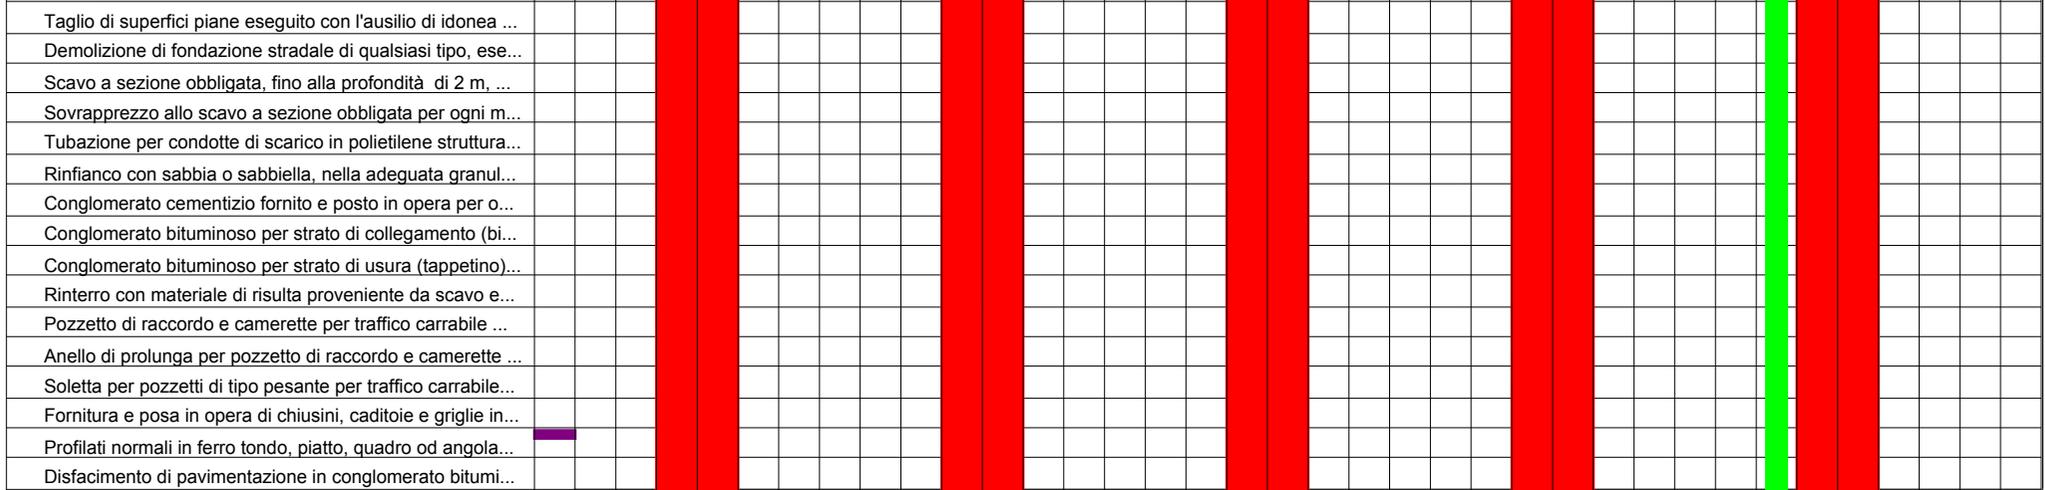

IMPIANTO ACCUMULO ACQUA PRIMA PIOGGIA PER 31...

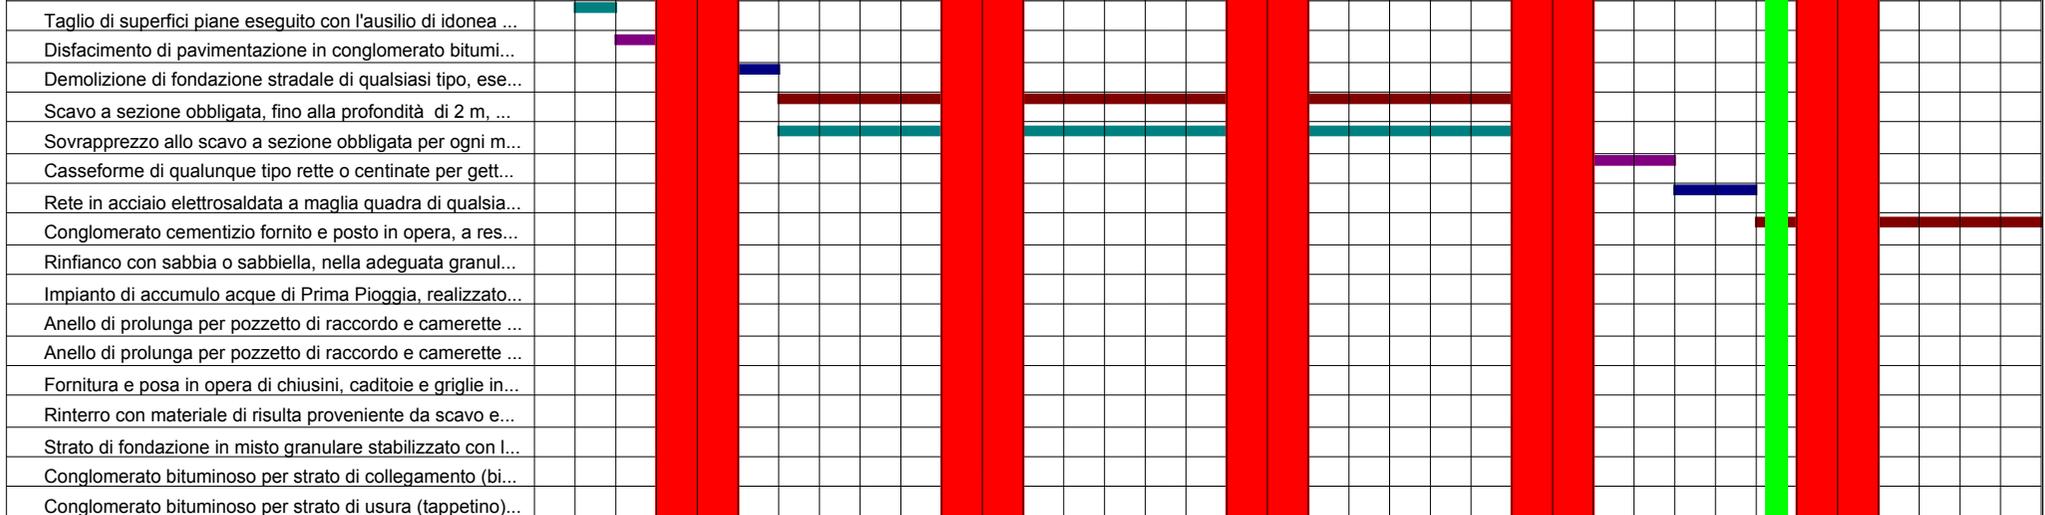


ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...




Mese	Marzo 2013											Aprile 2013																									
Giorno	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	3,28	0,00	0,00	3,28	3,28	3,28	2,54	83,50	0,00	0,00	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	0,00	0,00	6,29	6,29	6,29	0,91	0,91	0,00	0,00	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,00	0,00	0,91	0,91	1,65	0,00	1,65	0,00
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	112,3	112,3	112,3	115,6	118,9	122,2	124,7	208,2	208,2	291,7	375,2	458,7	542,2	625,7	625,7	625,7	632,0	638,3	644,6	645,5	646,4	646,4	646,4	647,3	648,3	649,2	650,1	651,0	651,0	651,9	652,8	654,5	654,5	656,1	656,1		
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SP2 SP3 SP4 SP5


RETE ACQUE BIANCHE

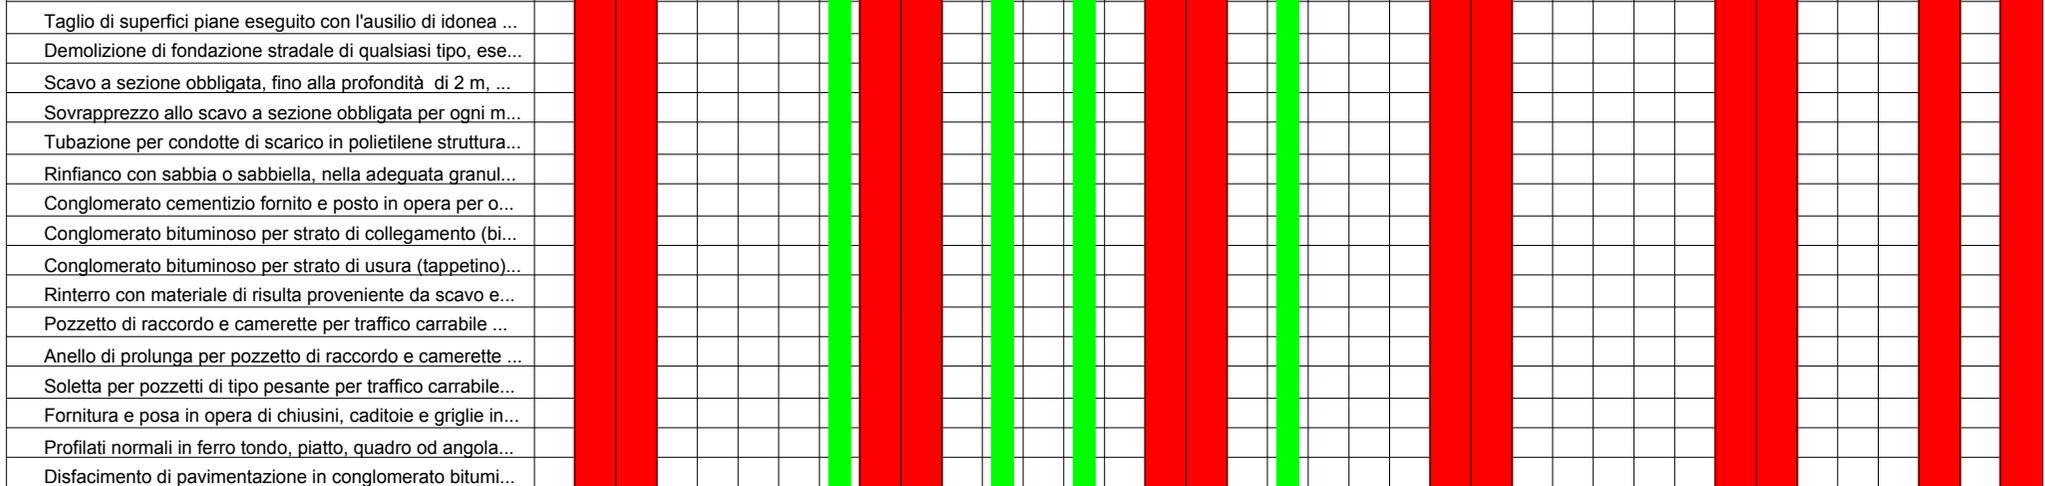

IMPIANTO ACCUMULO ACQUA PRIMA PIOGGIA PER 31...

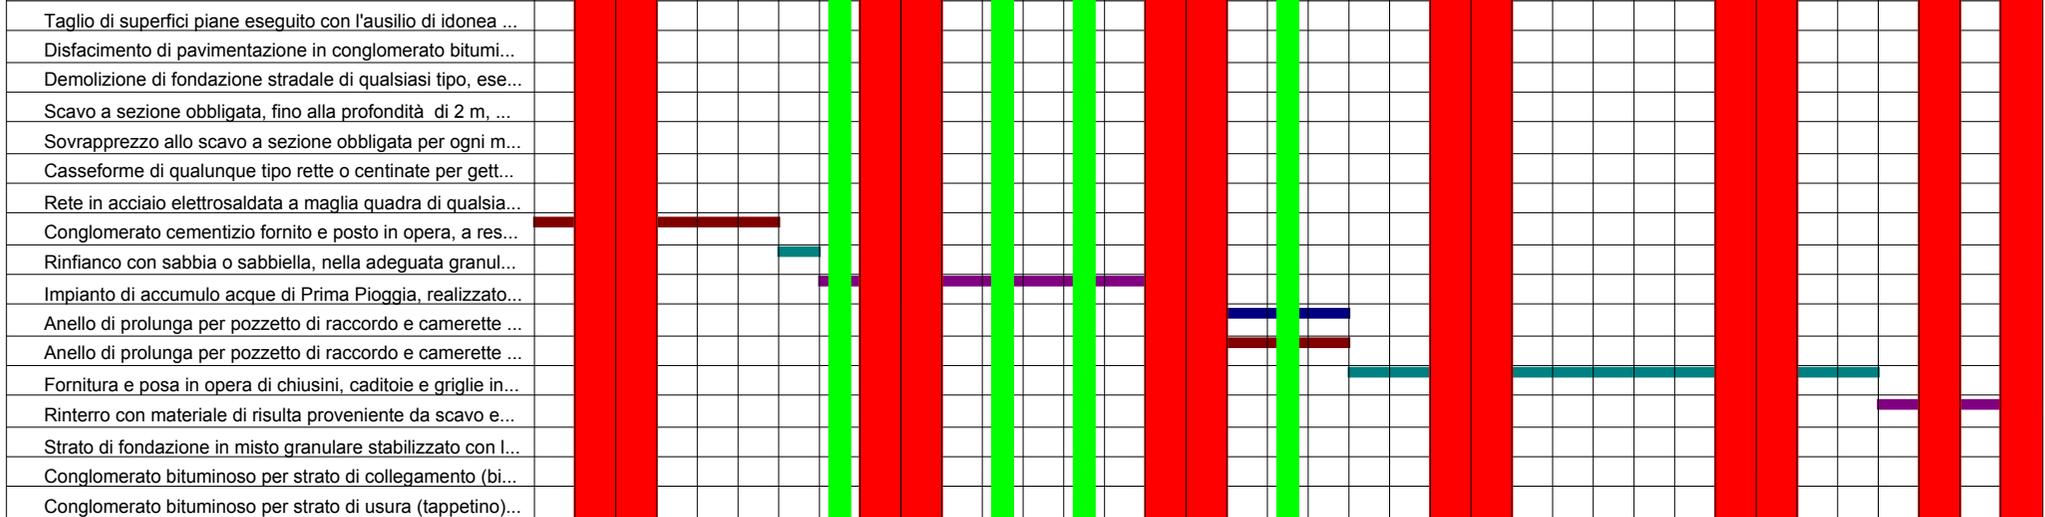

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...



Mese	Maggio 2013																															Giu							
Giorno	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3		
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	1,65	1,65	11,38	1,80	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	0,54	0,00	0,00	0,75	1,06	1,06	0,00	9,89	0,00	0,00	4,08	2,96	1,72	2,80	1,45	0,00	0,00	0,29		
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	656,1	657,8	659,4	659,4	661,1	662,7	662,7	662,7	664,4	666,0	677,4	679,2	681,0	681,0	682,8	684,7	686,5	688,3	688,8	688,8	688,8	689,6	690,6	691,7	691,7	701,6	701,6	701,6	705,7	708,6	710,4	713,2	714,6	714,6	714,9				
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RETE ACQUE BIANCHE

- Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...
- Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...
- Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ...
- Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...
- Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttura...
- Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granul...
- Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...
- Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...
- Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...
- Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...
- Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...
- Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...
- Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...
- Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...
- Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...
- Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

IMPIANTO ACCUMULO ACQUA PRIMA PIOGGIA PER 31...

- Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...
- Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...
- Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...
- Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ...
- Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...
- Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...
- Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsia...
- Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...
- Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granul...
- Impianto di accumulo acque di Prima Pioggia, realizzato...
- Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...
- Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...
- Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...
- Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...
- Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con l...
- Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...
- Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

- Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...
- Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...
- Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ...

Mese	Luglio 2013														Agosto 2013																							
Giorno	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	1,19	1,19	0,00	0,00	1,19	1,19	3,19	3,19	2,44	0,00	0,00	3,83	3,83	3,83	2,38	2,38	0,00	0,00	22,42	22,42	1,27	0,48	0,75	0,00	0,00	0,27	17,65	6,36	2,16	2,05	0,00	0,00	1,06	0,41	0,41	0,00	0,50	
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	759,5760	7760,7760	7760,7760	7761,8763	7766,2769	4771,9771	9771,9775	7779,5783	4785,8788	2788,2788	2810,6833	0834,3834	8835,5835	5835,5835	8853,4859	8862,0864	0864,0864	0865,1865	5865,9865	9866,4																		
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

SP7

RETE ACQUE BIANCHE

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ...
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...
Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttura...
Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granul...
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...
Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...
Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...
Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...
Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...
Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

IMPIANTO ACCUMULO ACQUA PRIMA PIOGGIA PER 31...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ...
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...
Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsia...
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...
Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granul...
Impianto di accumulo acque di Prima Poggia, realizzato...
Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...
Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...
Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con l...
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...
Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ...

Mese	Agosto 2013														Settembre 2013																							
Giorno	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	0,00	0,00	0,11	0,28	2,27	0,33	0,11	0,00	0,00	0,92	1,79	2,51	0,91	0,74	0,00	0,00	0,74	0,74	0,74	1,45	1,45	0,00	0,00	0,61	0,61	0,97	14,33	0,11	0,00	0,00	0,16	0,25	0,09	0,00	5,88	0,00	0,00	
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	866,48	866,48	866,68	866,88	869,18	869,48	869,68	869,68	869,68	870,58	872,38	874,88	875,78	876,58	876,58	877,28	878,08	878,78	880,28	881,68	881,68	882,28	882,88	883,88	889,18	898,38	898,38	898,38	898,48	898,78	898,88	898,88	899,48	899,48	899,48	899,48	899,48	899,48
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RETE ACQUE BIANCHE


- Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...
- Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...
- Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ...
- Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...
- Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttura...
- Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granul...
- Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...
- Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...
- Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...
- Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...
- Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...
- Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...
- Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...
- Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...
- Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...
- Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

IMPIANTO ACCUMULO ACQUA PRIMA PIOGGIA PER 31...

- Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...
- Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...
- Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...
- Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ...
- Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...
- Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...
- Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsia...
- Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...
- Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granul...
- Impianto di accumulo acque di Prima Pioggia, realizzato...
- Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...
- Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...
- Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...
- Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...
- Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con l...
- Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...
- Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

- Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...
- Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...
- Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ...

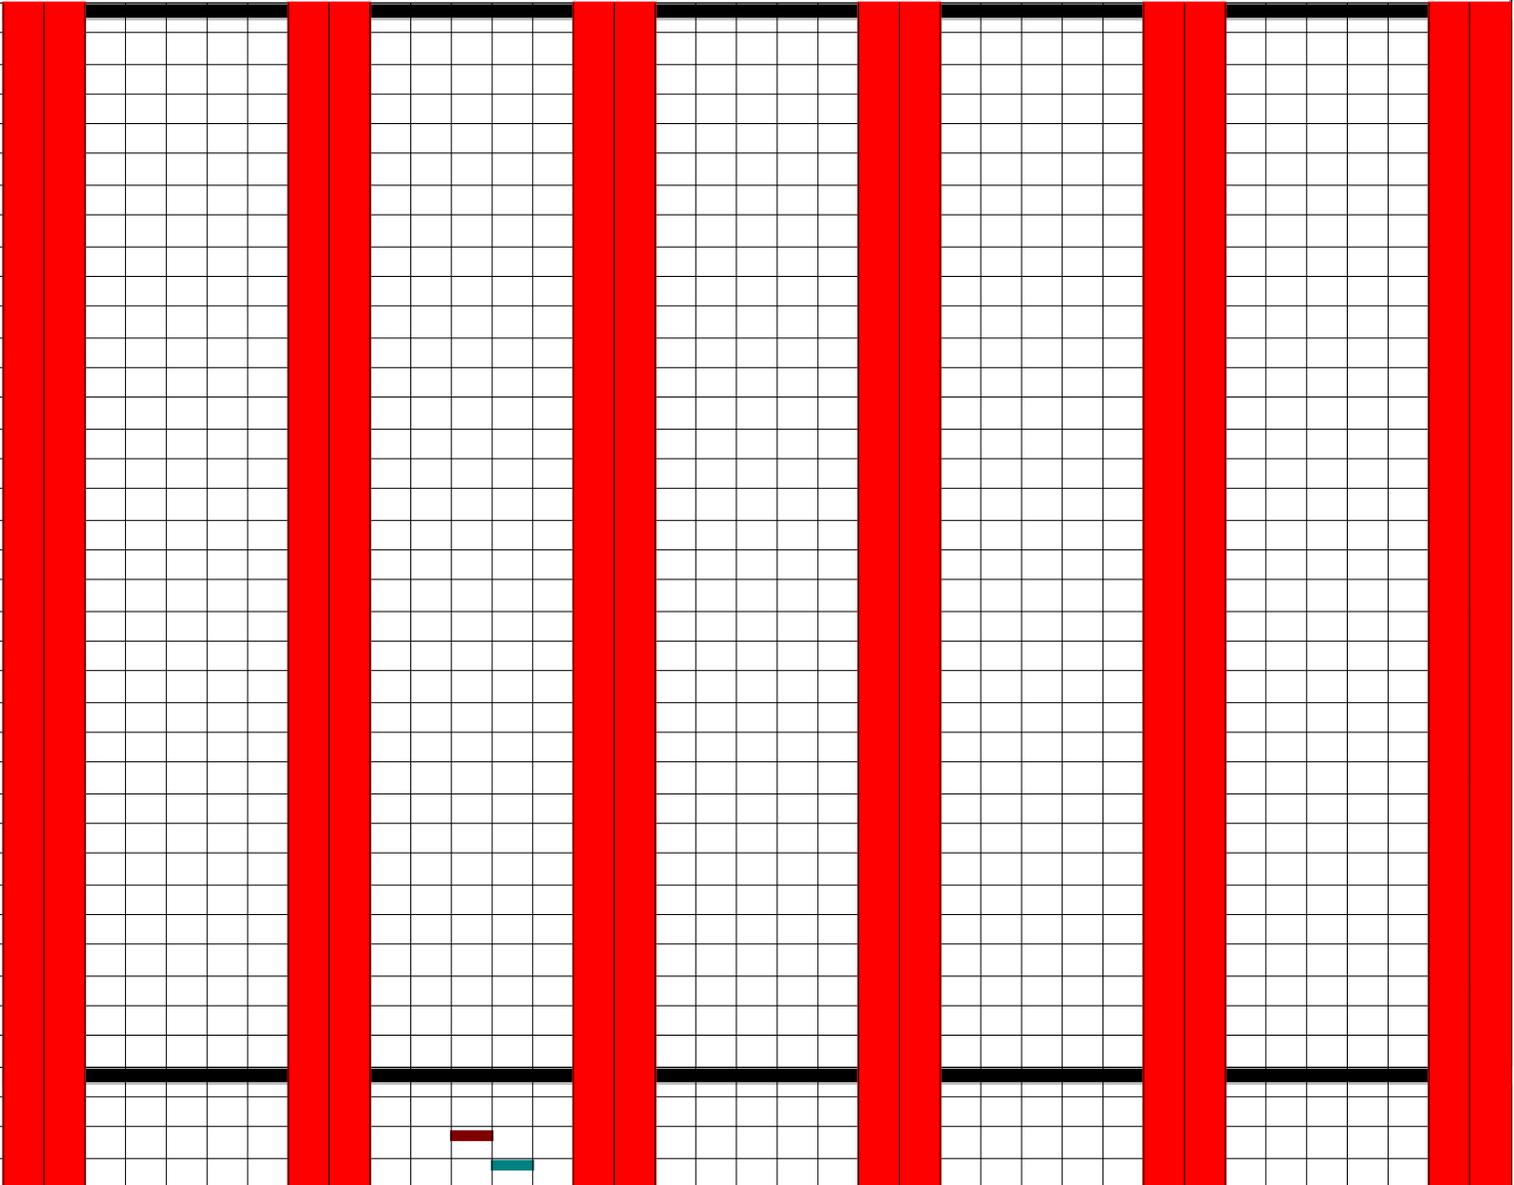

Mese	Settembre 2013										Ottobre 2013																										
Giorno	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	2,12	0,08	0,11	0,28	0,75	0,00	0,00	0,02	0,08	0,03	0,92	0,97	0,00	0,00	0,50	1,03	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,71	0,71	0,71	0,43	1,01	0,00	0,00	0,62	0,62	0,62	0,90	0,62	0,00	0,00	0,62	0,66
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	906,89	906,89	907,09	907,29	908,09	908,09	908,09	908,09	908,19	908,29	909,19	910,19	910,19	910,19	910,69	911,69	912,39	913,09	913,79	913,79	914,49	915,29	915,99	916,39	917,39	917,39	918,09	918,69	919,29	920,19	920,79	920,79	921,49	922,0			
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RETE ACQUE BIANCHE

- Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...
- Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...
- Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ...
- Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...
- Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttura...
- Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granul...
- Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...
- Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...
- Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...
- Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...
- Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...
- Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...
- Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...
- Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...
- Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...
- Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

IMPIANTO ACCUMULO ACQUA PRIMA PIOGGIA PER 31...

- Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...
- Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...
- Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...
- Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ...
- Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...
- Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...
- Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsia...
- Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...
- Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granul...
- Impianto di accumulo acque di Prima Pioggia, realizzato...
- Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...
- Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...
- Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...
- Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...
- Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con l...
- Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...
- Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

- Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...
- Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...
- Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ...

Mese	Dicembre 2013																															Gennaio 2014										
Giorno	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	0,27	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,06	0,06	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	928,79	928,79	928,79	928,89	929,09	929,29	929,39	929,39	929,39	929,49	929,59	929,69	929,79	929,79	929,79	929,93	930,09	930,09	930,09	930,09	930,19	930,19	930,19	930,19	930,19	930,19	930,29	930,39	930,39	930,39	930,39	930,49	930,49	930,49	930,49	930,49	930,49	930,49	930,49			
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

RETE ACQUE BIANCHE

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...
 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...
 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ...
 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...
 Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttura...
 Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granul...
 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...
 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...
 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...
 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...
 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...
 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...
 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...
 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...
 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...
 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

IMPIANTO ACCUMULO ACQUA PRIMA PIOGGIA PER 31...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...
 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...
 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...
 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ...
 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...
 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...
 Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsia...
 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...
 Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granul...
 Impianto di accumulo acque di Prima Pioggia, realizzato...
 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...
 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...
 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...
 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...
 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con l...
 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...
 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...
 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...
 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ...

Mese	Gennaio 2014				
Giorno	12	13	14	15	16
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	930,49	930,49	930,49	930,49	932,1
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SP9

RETE ACQUE BIANCHE

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...
 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...
 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ...
 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...
 Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttura...
 Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granul...
 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...
 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...
 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...
 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...
 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...
 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...
 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...
 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...
 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...
 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...


IMPIANTO ACCUMULO ACQUA PRIMA PIOGGIA PER 31...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...
 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...
 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...
 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ...
 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...
 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...
 Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsia...
 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...
 Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granul...
 Impianto di accumulo acque di Prima Piovra, realizzato...
 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...
 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...
 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...
 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...
 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con l...
 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...
 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...


Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...
 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...
 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ...

Mese	Apr			Maggio 2013																												Giu					
Giorno	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	1,65	1,65	11,38	1,80	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	0,54	0,00	0,00	0,75	1,06	1,06	0,00	9,89	0,00	0,00	4,08	2,96	1,72	2,80	1,45	0,00	0,00	0,29
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	656,1	657,8	659,4	659,4	661,1	662,7	662,7	662,7	664,4	666,0	677,4	679,2	681,0	681,0	682,8	684,7	686,5	688,3	688,8	688,8	688,8	689,6	690,6	691,7	691,7	701,6	701,6	701,6	705,7	708,6	710,4	713,2	714,6	714,6	714,9		
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

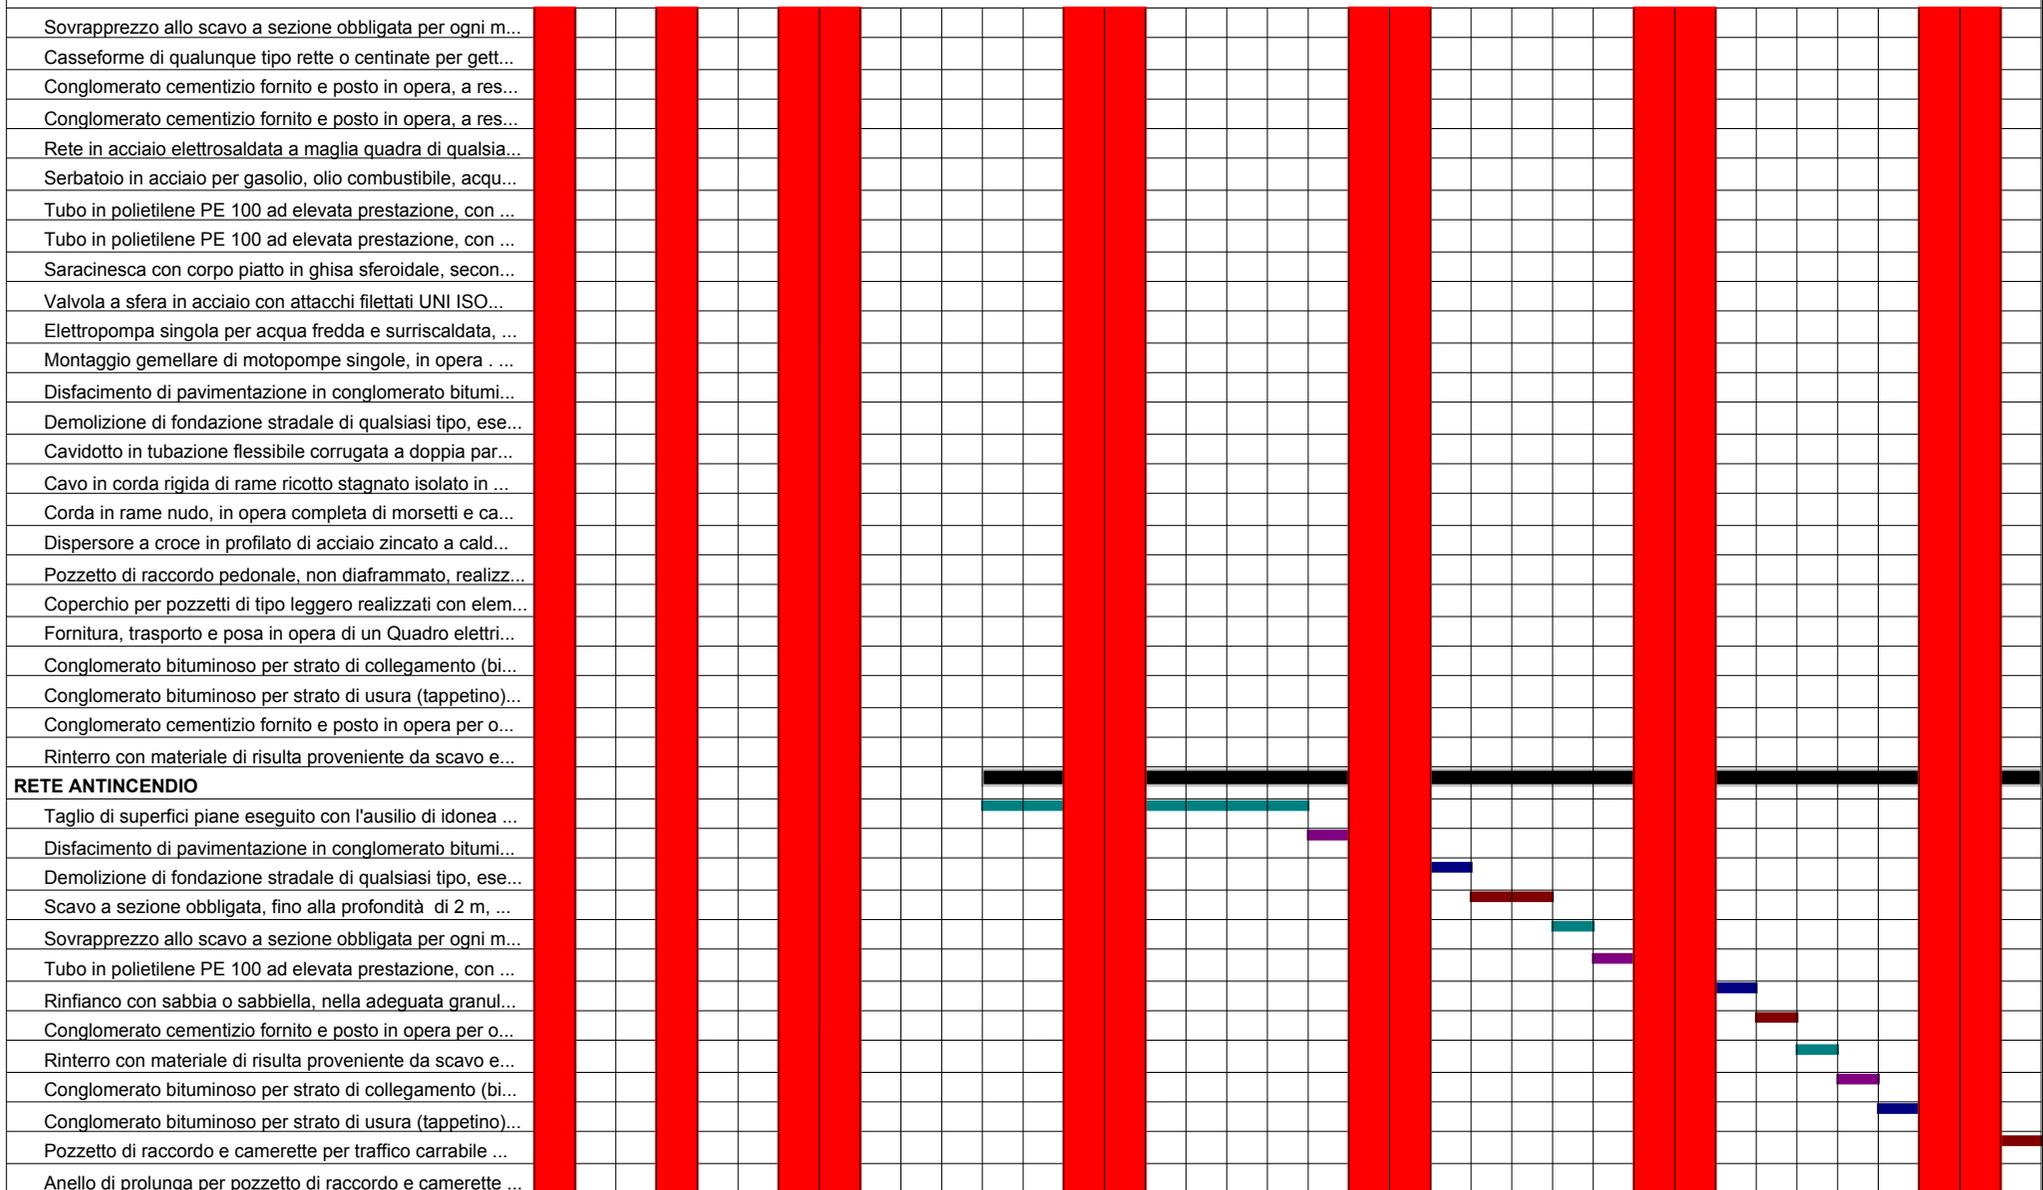


Mese	Luglio 2013														Agosto 2013																							
Giorno	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	1,19	1,19	0,00	0,00	1,19	1,19	3,19	3,19	2,44	0,00	0,00	3,83	3,83	3,83	2,38	2,38	0,00	0,00	22,42	22,42	1,27	0,48	0,75	0,00	0,00	0,27	17,65	6,36	2,16	2,05	0,00	0,00	1,06	0,41	0,41	0,00	0,50	
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	759,5760	7760,7760	7760,7760	7761,8763	7766,2769	4771,9771	9771,9775	7779,5783	4785,8788	2788,2788	2810,6833	0834,3834	8835,5835	5835,5835	8853,4859	8862,0864	0864,0864	0865,1865	5865,9865	9866,4																		
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	


SP7

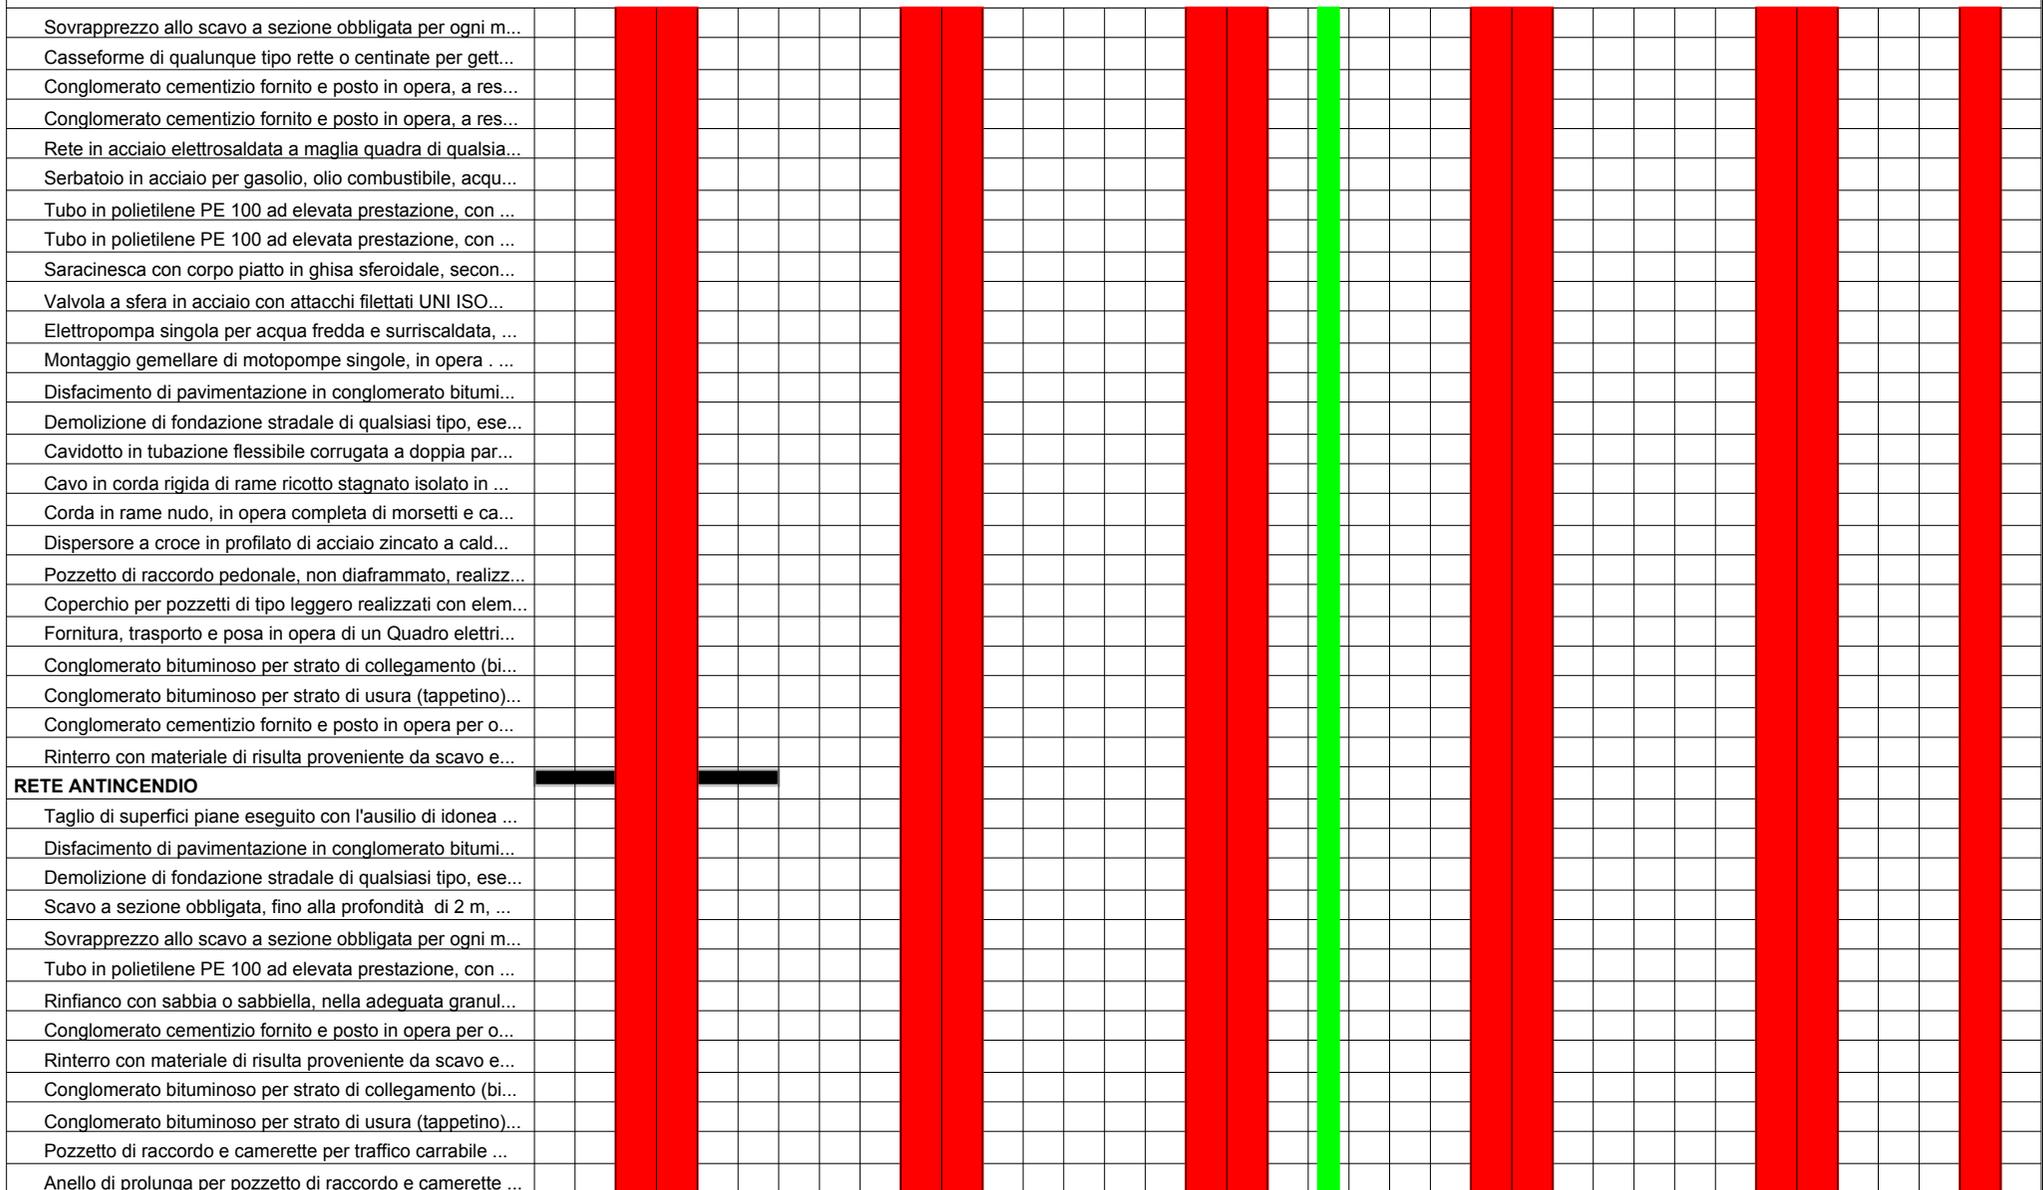

Mese	Agosto 2013														Settembre 2013																							
Giorno	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	0,00	0,00	0,11	0,28	2,27	0,33	0,11	0,00	0,00	0,92	1,79	2,51	0,91	0,74	0,00	0,00	0,74	0,74	0,74	1,45	1,45	0,00	0,00	0,61	0,61	0,97	14,33	0,11	0,00	0,00	0,16	0,25	0,09	0,00	5,88	0,00	0,00	
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	866,4	866,4	866,6	866,8	869,1	869,4	869,6	869,6	869,6	870,5	872,3	874,8	875,7	876,5	876,5	877,2	878,0	878,7	880,2	881,6	881,6	882,2	882,8	883,3	889,8	898,3	898,3	898,3	898,4	898,7	898,8	898,8	899,4	899,4	899,4	899,4	899,4	899,4
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

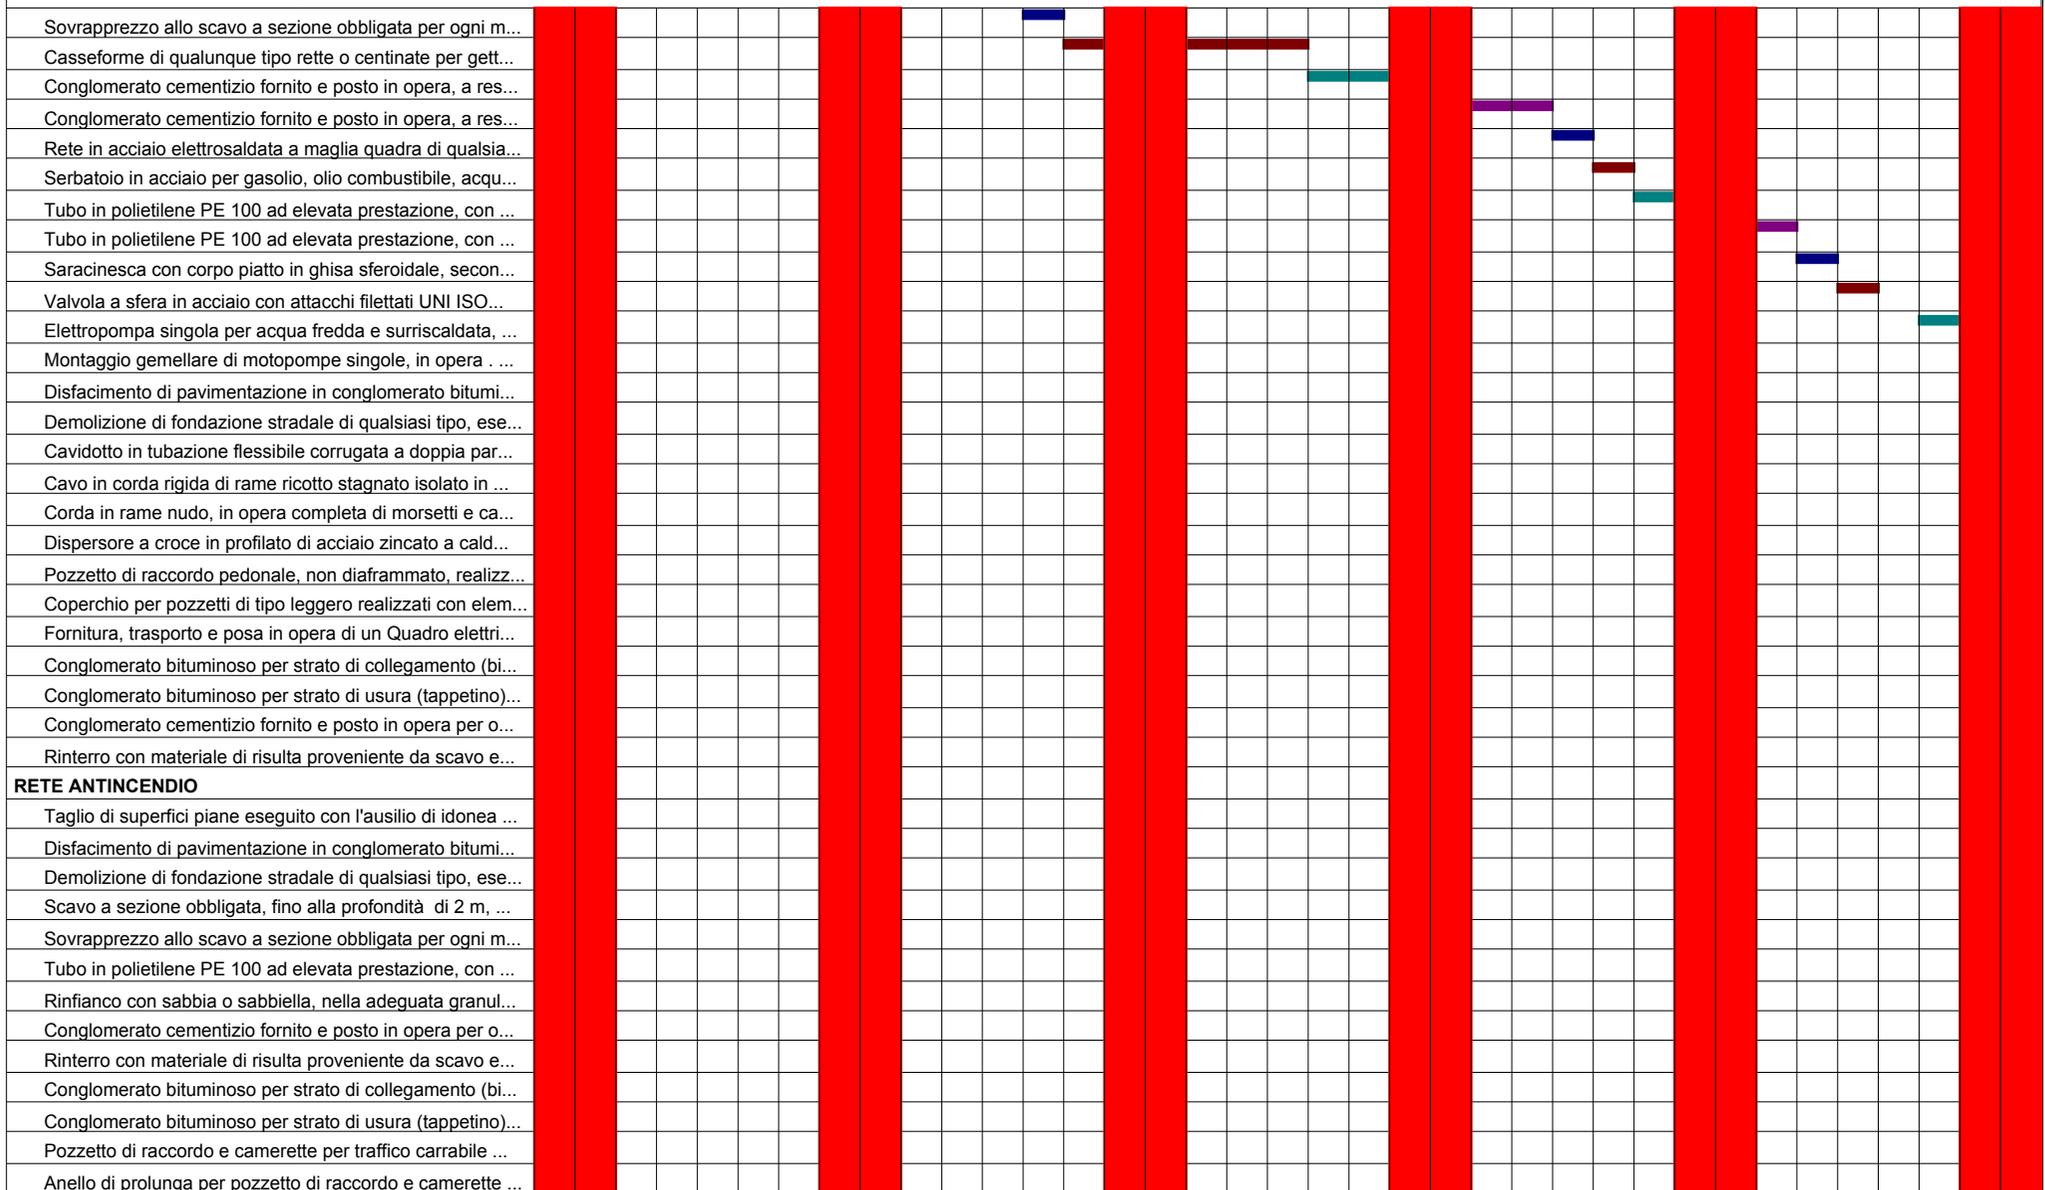


Mese	Settembre 2013										Ottobre 2013																										
Giorno	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	2,12	0,08	0,11	0,28	0,75	0,00	0,00	0,02	0,08	0,03	0,92	0,97	0,00	0,00	0,50	1,03	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,71	0,71	0,71	0,43	1,01	0,00	0,00	0,62	0,62	0,62	0,90	0,62	0,00	0,00	0,62	0,66
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	906,89	906,89	907,09	907,29	908,04	908,04	908,06	908,08	908,16	908,24	909,16	910,13	910,13	910,13	910,63	911,66	912,37	913,08	913,79	913,79	914,49	915,20	915,91	916,62	917,33	917,33	917,33	918,04	918,65	919,26	920,12	920,73	920,73	921,44	922,05		
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

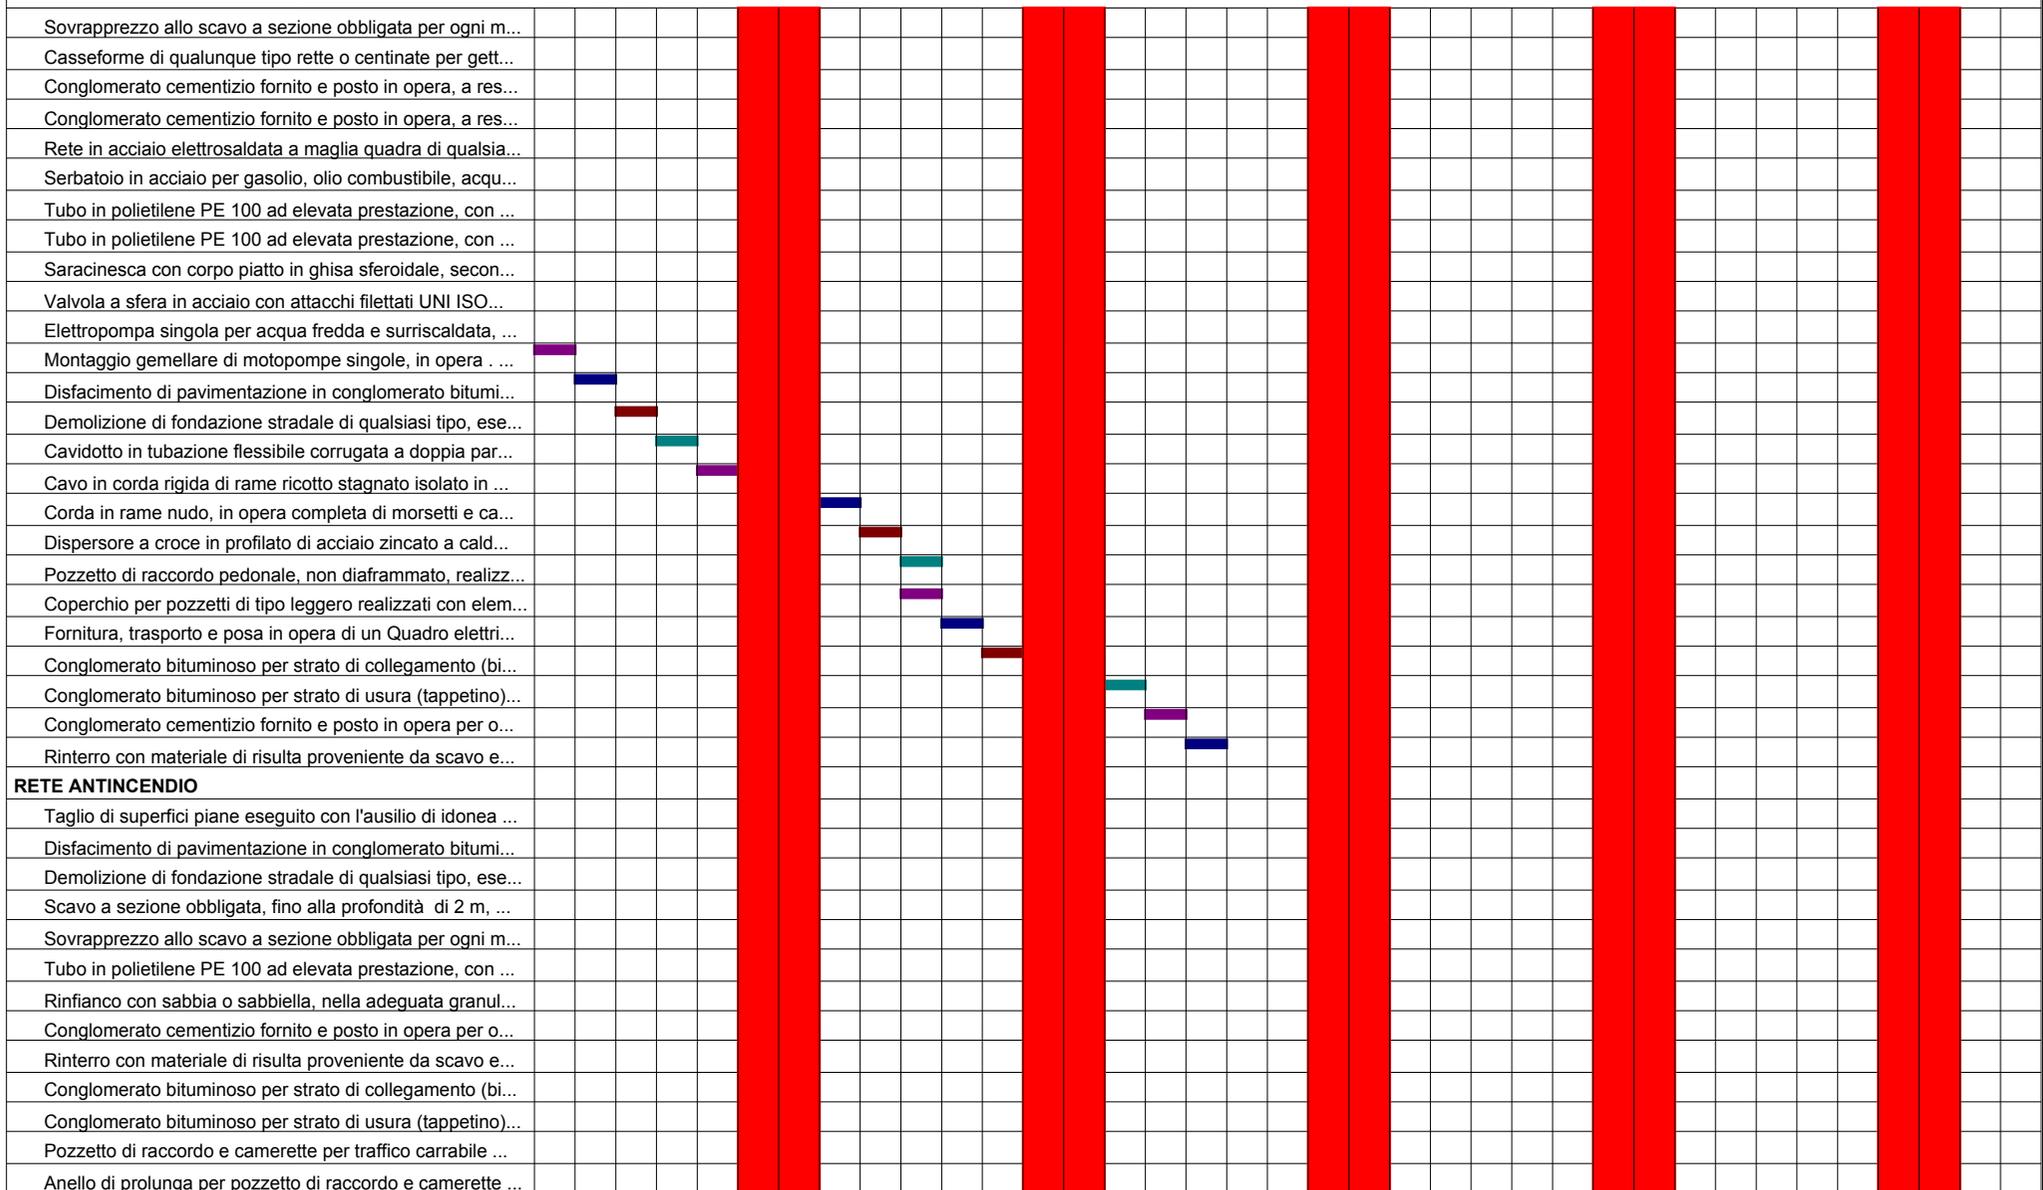

Mese	Giugno 2013																														Luglio 2013									
Giorno	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	0,82	1,26	1,10	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	1,87	1,87	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	0,63	1,19	0,00	0,00	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	0,00	0,00	1,19	1,19	1,19		
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	715,7	717,0	718,1	720,0	720,0	721,9	723,7	725,6	727,5	729,4	729,4	731,2	733,1	735,0	736,9	739,4	739,4	739,4	741,9	744,4	746,9	747,5	748,7	748,7	749,9	751,1	752,3	753,5	754,7	754,7	755,9	757,1	758,3							
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		


SP6

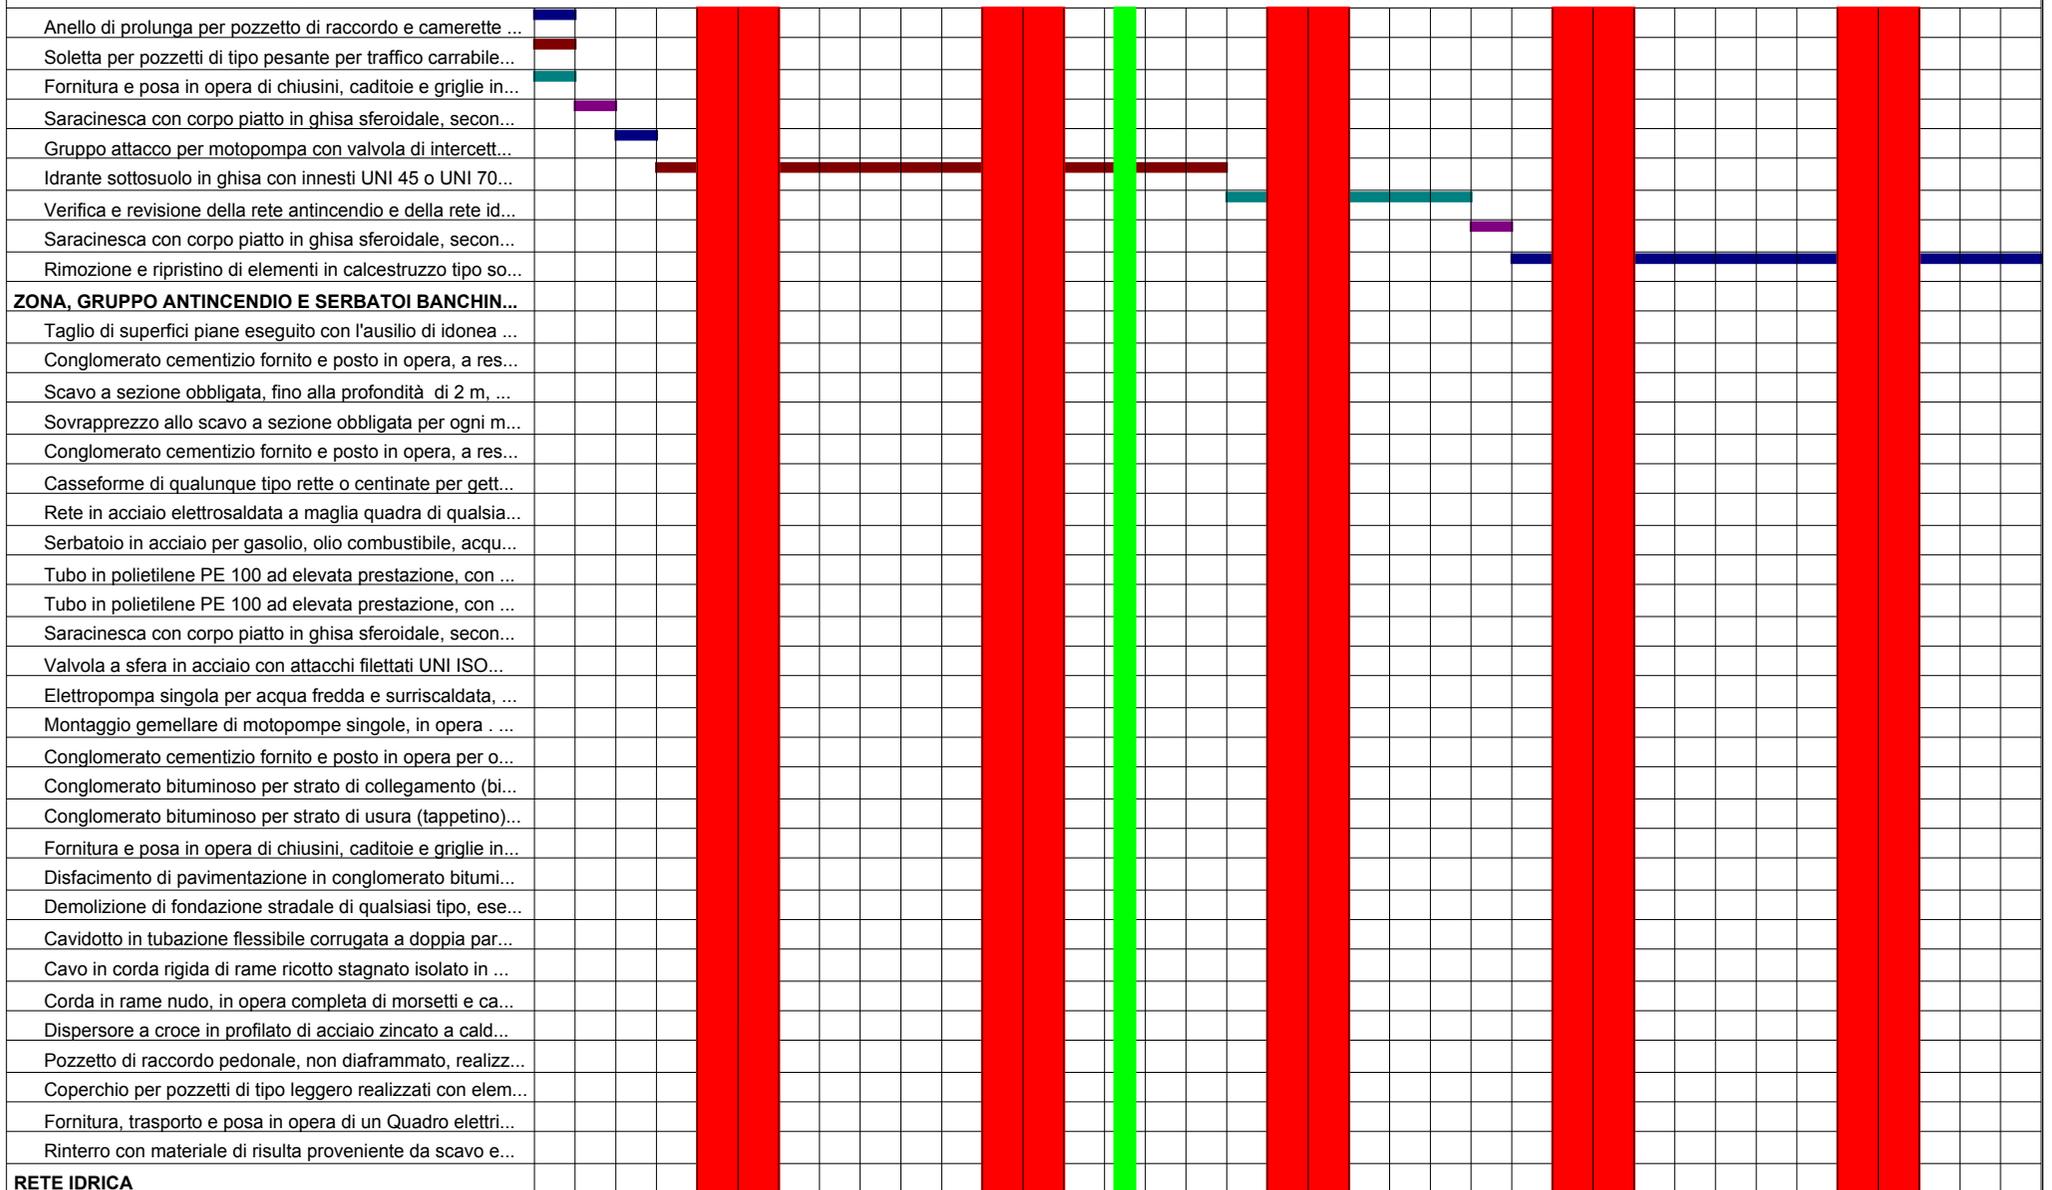

RETE IDRICA


Mese	Luglio 2013																															Agosto 2013															
Giorno	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	1,19	1,19	0,00	0,00	1,19	1,19	3,19	3,19	2,44	0,00	0,00	3,83	3,83	3,83	2,38	2,38	0,00	0,00	22,42	22,42	1,27	0,48	0,75	0,00	0,00	0,27	17,65	6,36	2,16	2,05	0,00	0,00	1,06	0,41	0,41	0,00	0,50										
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	759,5	760,7	760,7	760,7	761,8	763,0	766,2	769,4	771,9	771,9	771,9	775,7	779,5	783,4	785,8	788,2	788,2	2810,6	833,0	834,3	834,3	8835,5	8835,5	8835,5	8835,8	8853,4	8859,8	8862,0	8864,0	8864,0	8865,1	8865,5	8865,9	8865,9	8866,4												
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											

SP7

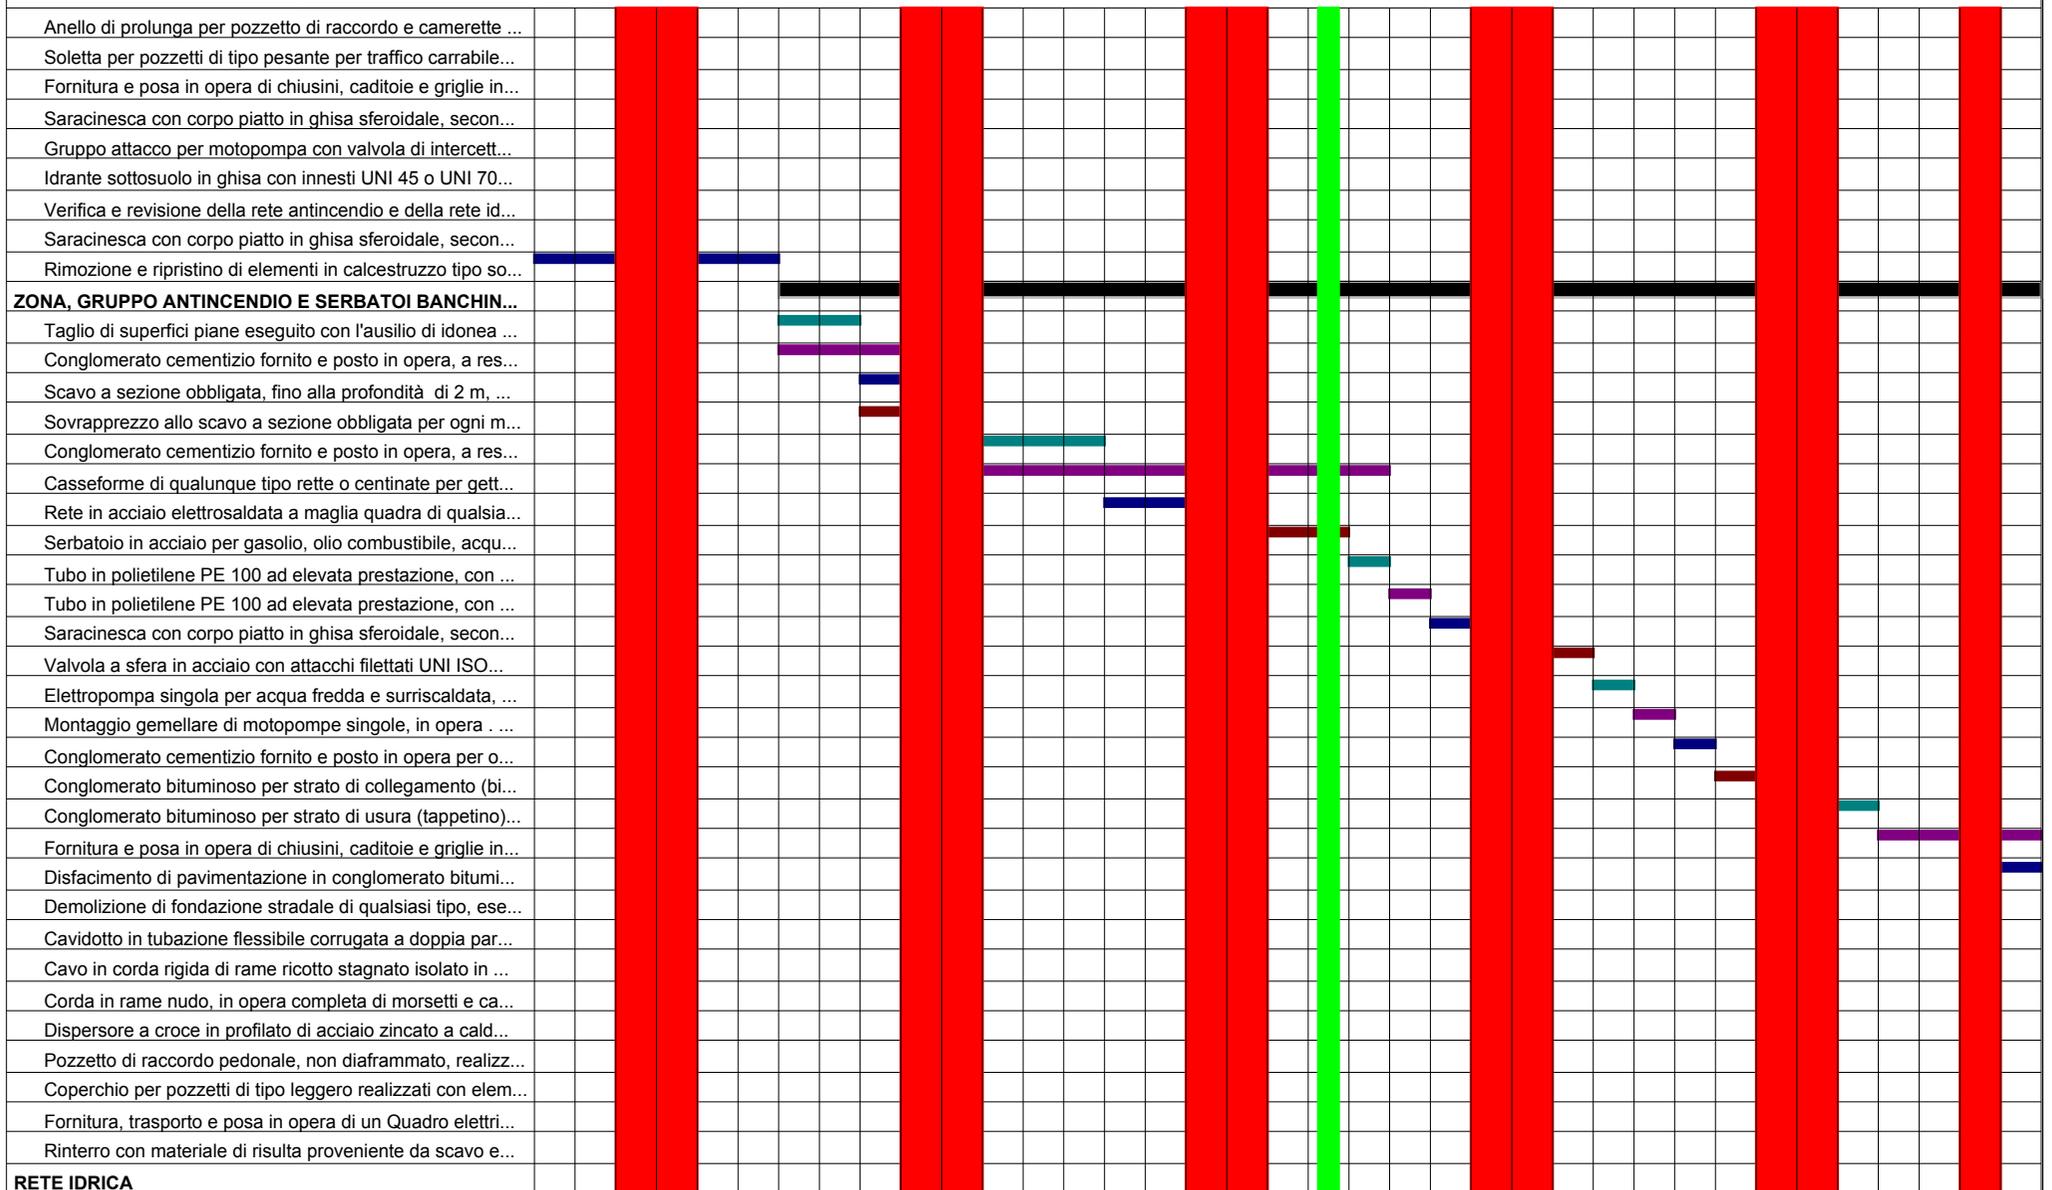


RETE IDRICA

Mese	Agosto 2013														Settembre 2013																							
Giorno	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	0,00	0,00	0,11	0,28	2,27	0,33	0,11	0,00	0,00	0,92	1,79	2,51	0,91	0,74	0,00	0,00	0,74	0,74	0,74	1,45	1,45	0,00	0,00	0,61	0,61	0,97	14,33	0,11	0,00	0,00	0,16	0,25	0,09	0,00	5,88	0,00	0,00	
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	866,4	866,4	866,6	866,8	869,1	869,4	869,6	869,6	869,6	870,5	872,3	874,8	875,7	876,5	876,5	877,2	878,0	878,7	880,2	881,6	881,6	882,2	882,8	883,8	889,1	898,3	898,3	898,3	898,4	898,7	898,8	898,8	899,4	899,4	899,4	899,4	899,4	899,4
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

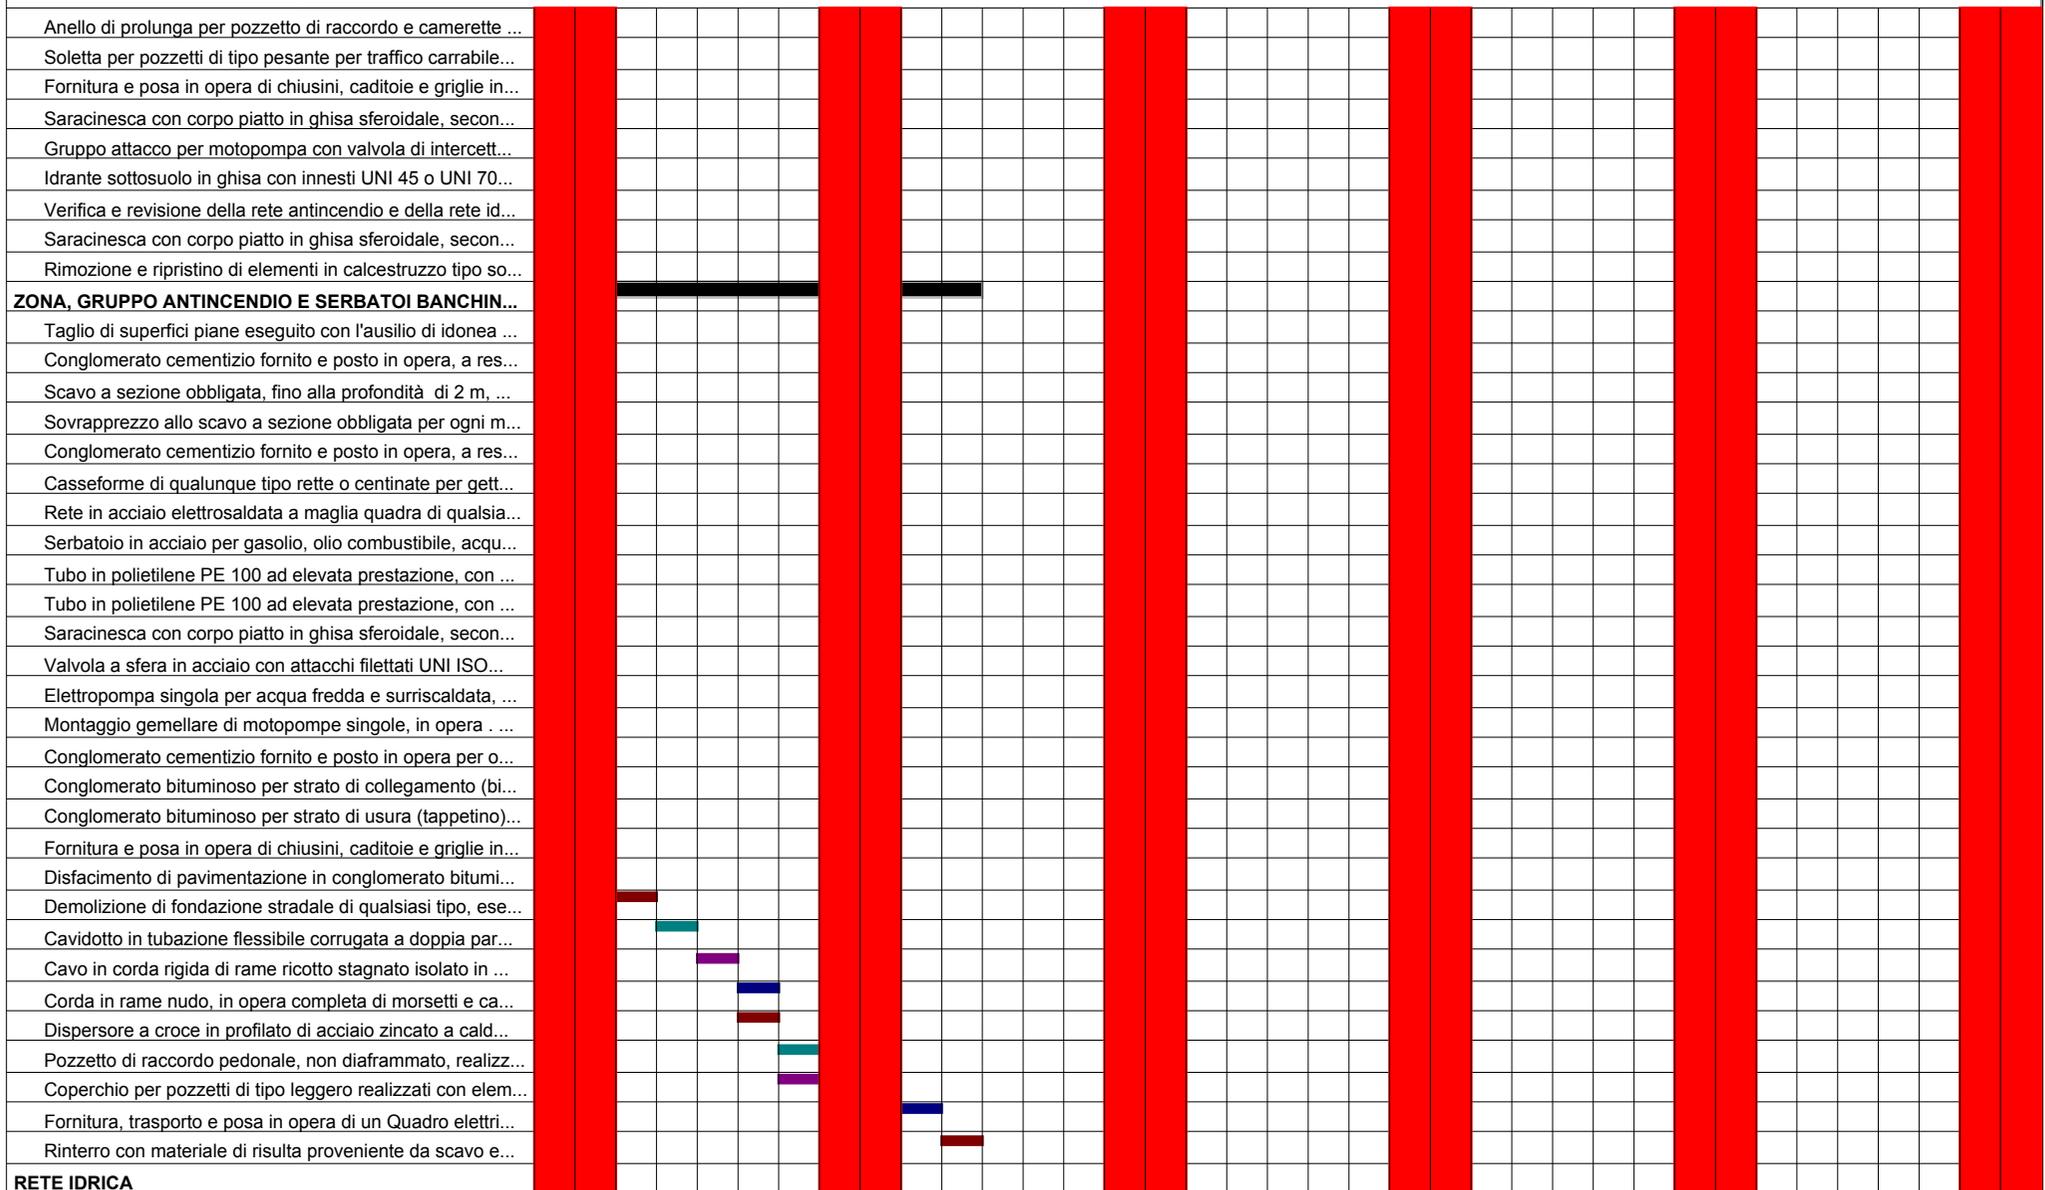


RETE IDRICA

Mese	Settembre 2013									Ottobre 2013																											
Giorno	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	2,12	0,08	0,11	0,28	0,75	0,00	0,00	0,02	0,08	0,03	0,92	0,97	0,00	0,00	0,50	1,03	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,71	0,71	0,71	0,43	1,01	0,00	0,00	0,62	0,62	0,62	0,90	0,62	0,00	0,00	0,62	0,66
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	906,89	906,89	907,09	907,29	908,09	908,09	908,09	908,09	908,19	908,29	909,19	910,19	910,19	910,19	910,69	911,69	912,39	913,09	913,79	913,79	914,49	915,29	915,99	916,39	917,39	917,39	918,09	918,69	919,29	920,19	920,79	920,79	921,49	922,09			
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

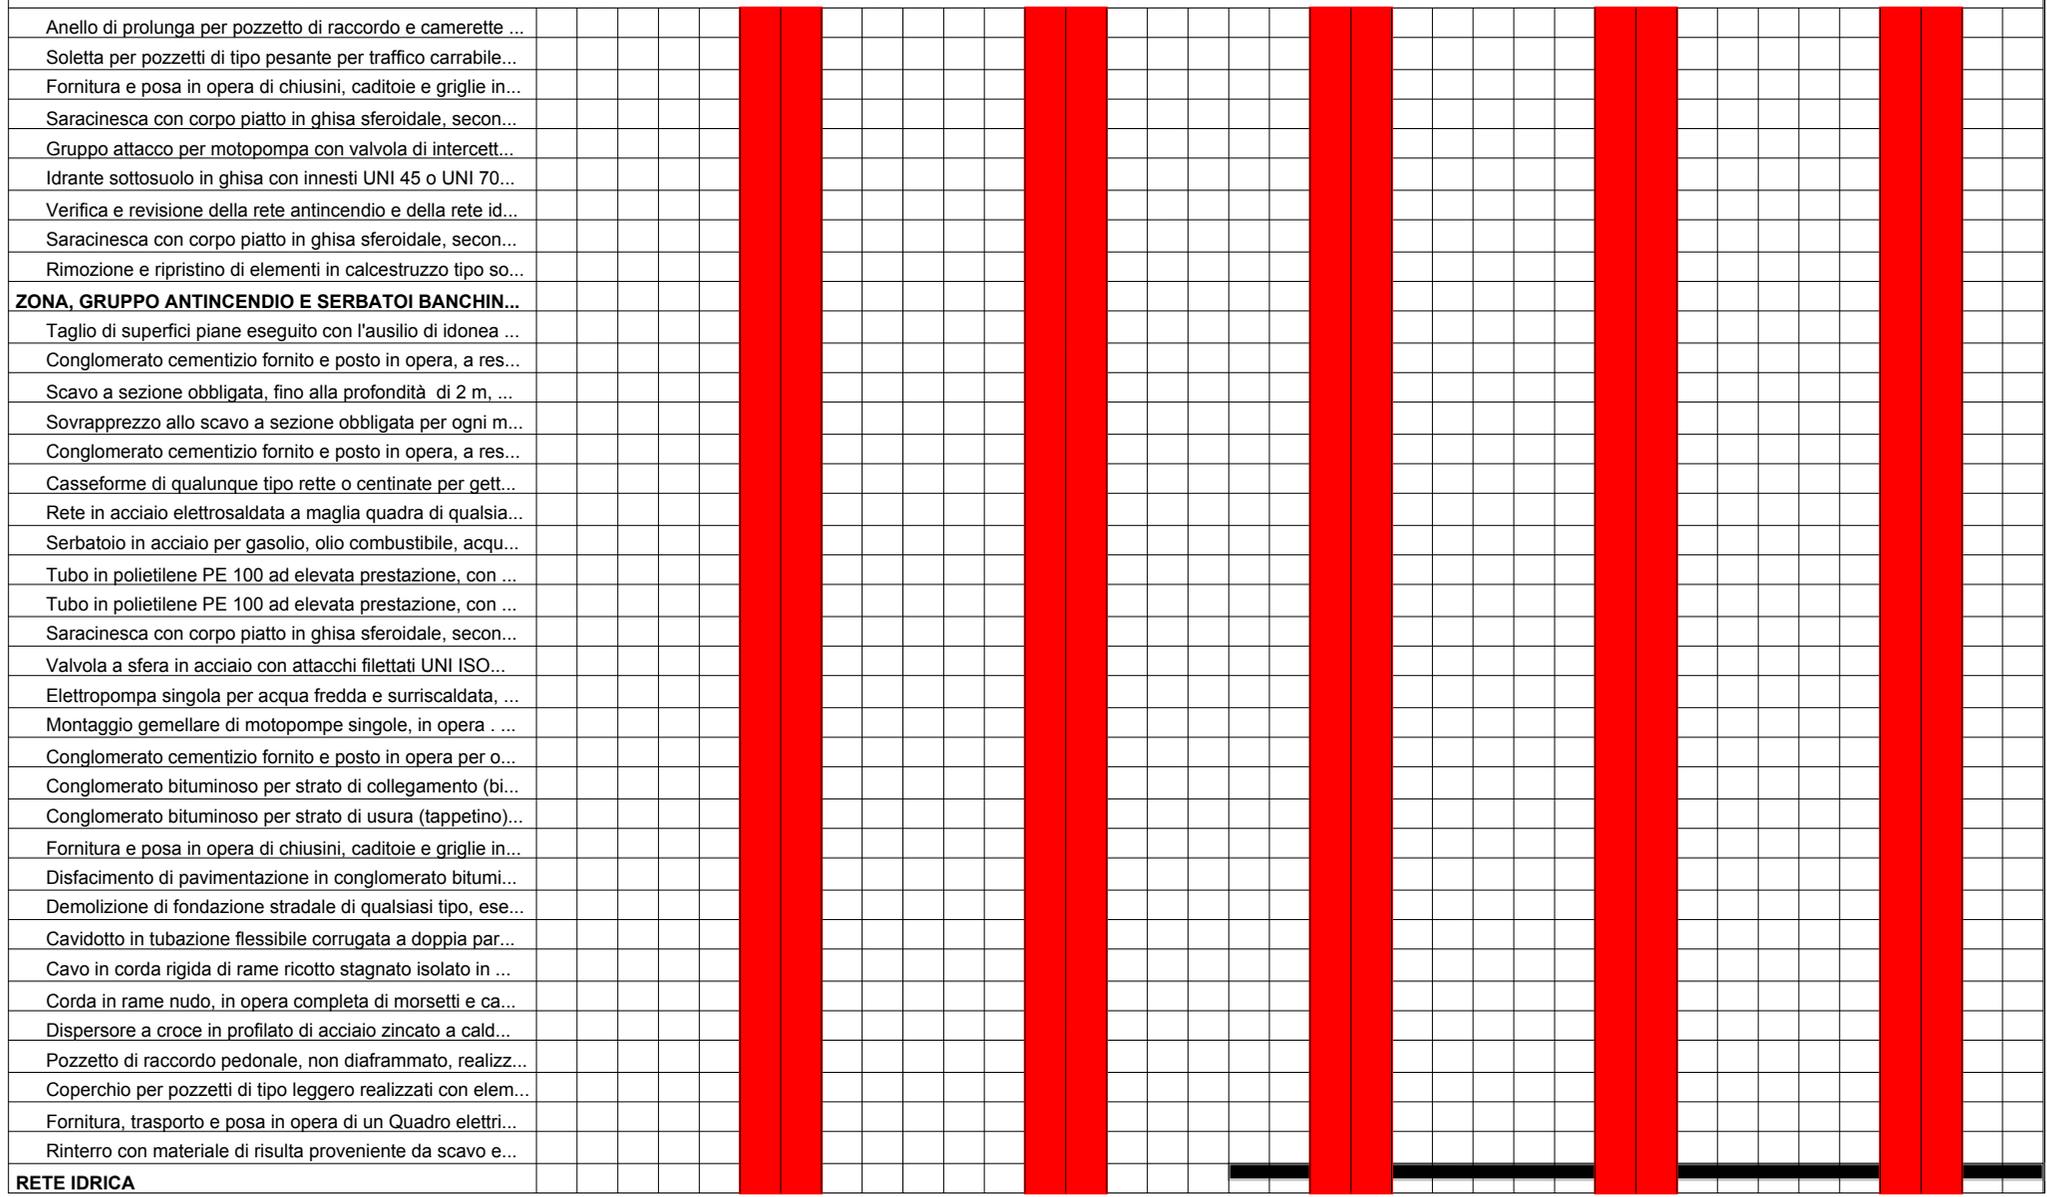


RETE IDRICA

Mese	Settembre 2013										Ottobre 2013																											
Giorno	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	2,12	0,08	0,11	0,28	0,75	0,00	0,00	0,02	0,08	0,03	0,92	0,97	0,00	0,00	0,50	1,03	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,71	0,71	0,71	0,43	1,01	0,00	0,00	0,62	0,62	0,62	0,90	0,62	0,00	0,00	0,62	0,66	
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	906,89	906,89	907,09	907,29	908,09	908,09	908,09	908,11	908,19	908,29	909,19	910,19	910,19	910,69	911,69	912,39	913,09	913,79	913,79	914,49	915,29	915,99	916,39	917,39	917,39	918,09	918,69	919,29	920,79	920,79	920,79	921,49	922,0					
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

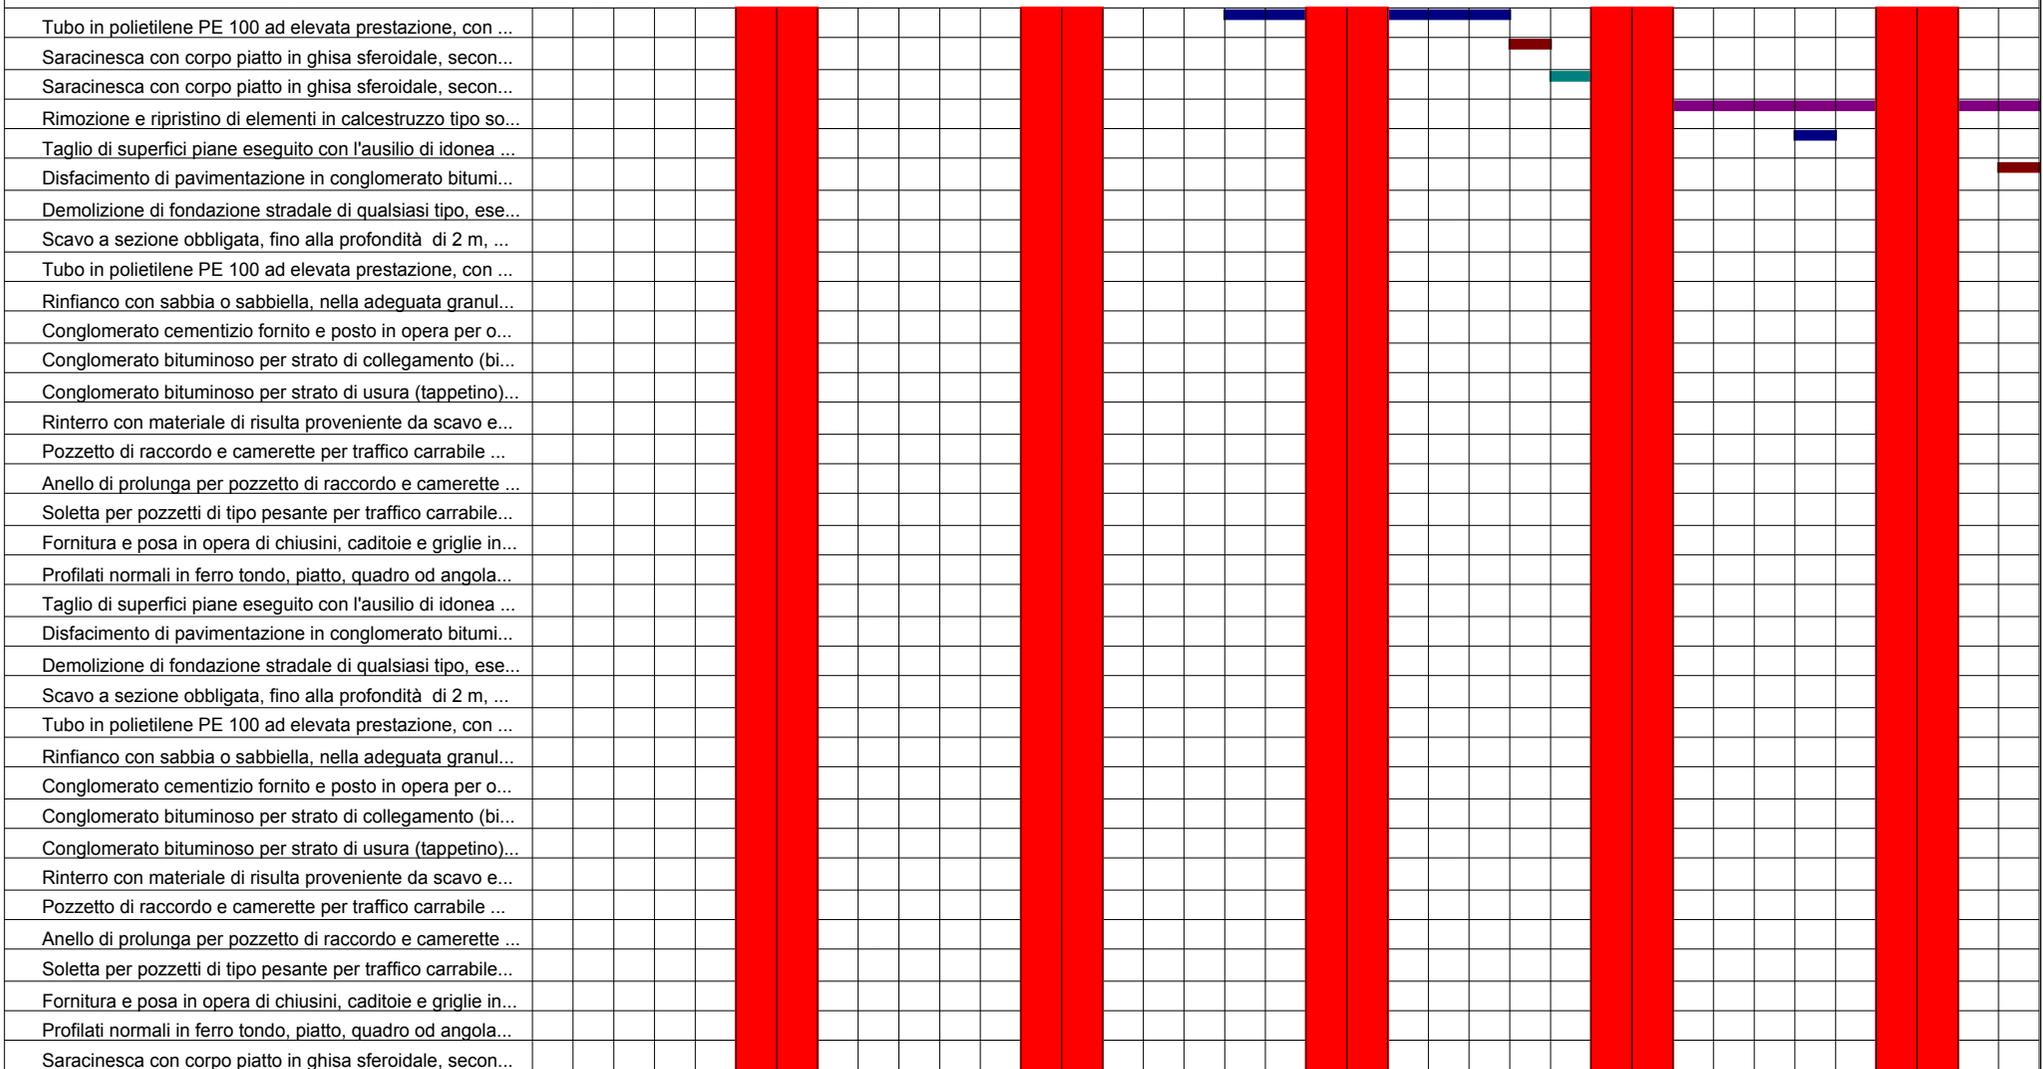

Mese	Ott		Novembre 2013																												Dicembre 2013							
Giorno	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	0,05	0,07	0,00	0,00	0,00	0,25	0,54	0,21	0,11	0,10	0,00	0,00	0,29	0,12	0,23	0,20	0,03	0,00	0,00	1,43	0,10	0,15	0,19	0,19	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,58	
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	922,1	922,2	922,2	922,2	922,2	922,4	923,0	923,2	923,3	923,4	923,4	923,4	923,7	923,8	924,0	924,2	924,3	924,3	924,3	925,7	925,8	926,0	926,2	926,4	926,4	926,5	926,6	926,8	926,8	927,0	927,0	927,0	927,0	927,0	927,3	927,6	927,8	928,4
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SP8

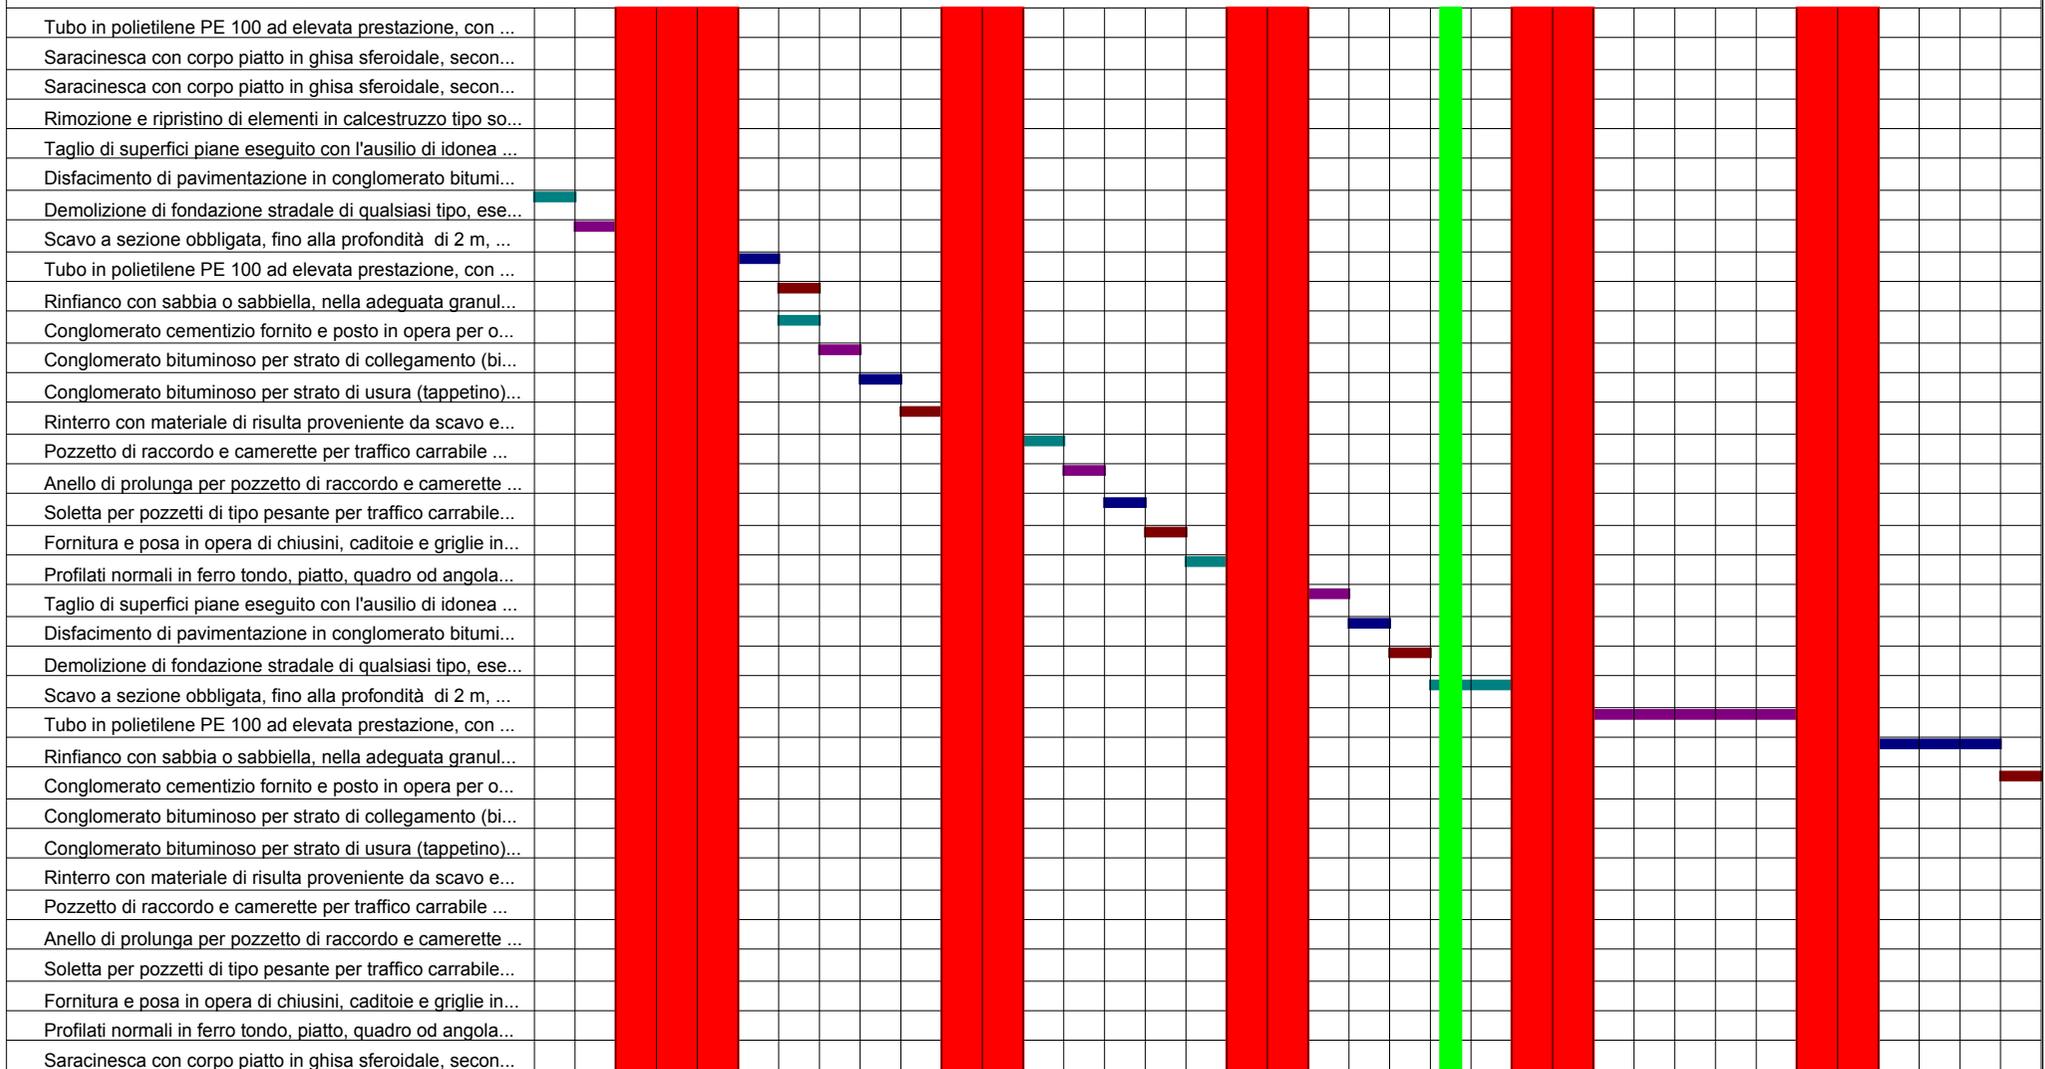

Mese	Dicembre 2013																															Gennaio 2014										
Giorno	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	0,27	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,06	0,06	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00					
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	928,79	928,79	928,79	928,89	929,09	929,29	929,39	929,39	929,39	929,49	929,59	929,69	929,79	929,79	929,79	929,99	930,09	930,09	930,09	930,09	930,09	930,19	930,19	930,19	930,19	930,19	930,29	930,39	930,39	930,39	930,39	930,49	930,49	930,49	930,49	930,49						
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

