


# PLANIMETRIA CON DETTAGLIO LAVORAZIONI PER SOTTO FASI

## SOTTO FASE 1

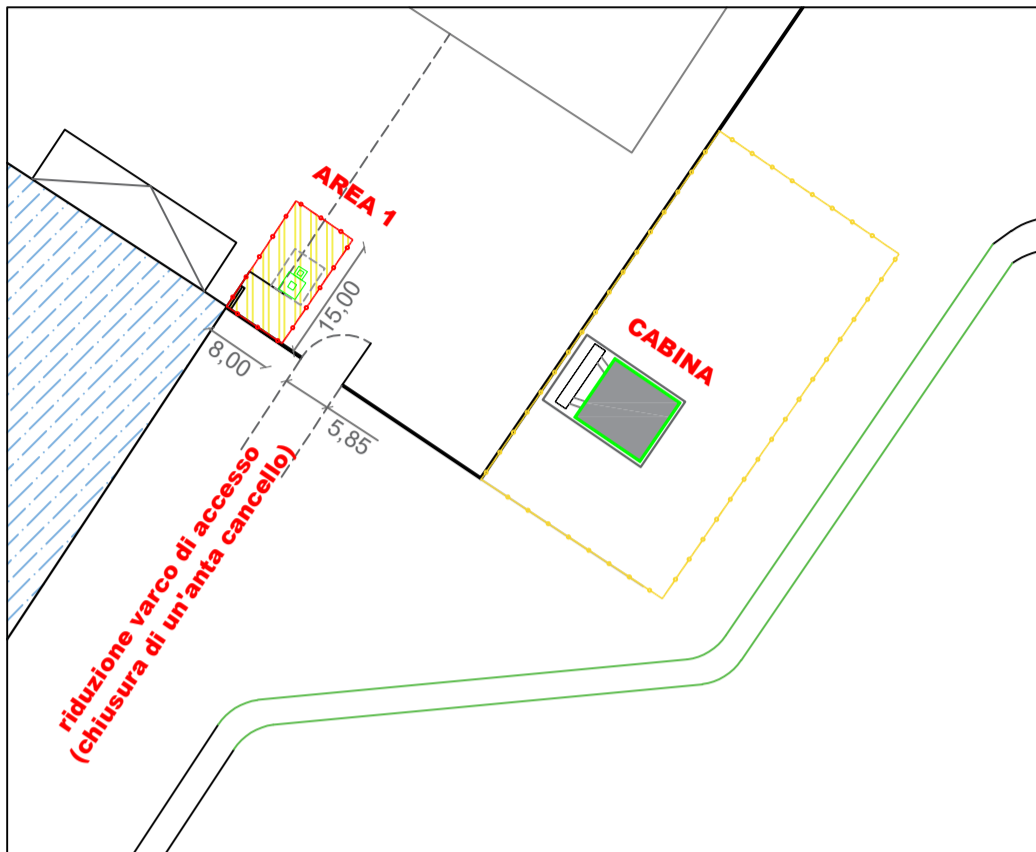


### LAVORAZIONI IN AREA 1:

- scavo
- posa pozzetto per JB

**DURATA: 3GG**

## SOTTO FASE 2

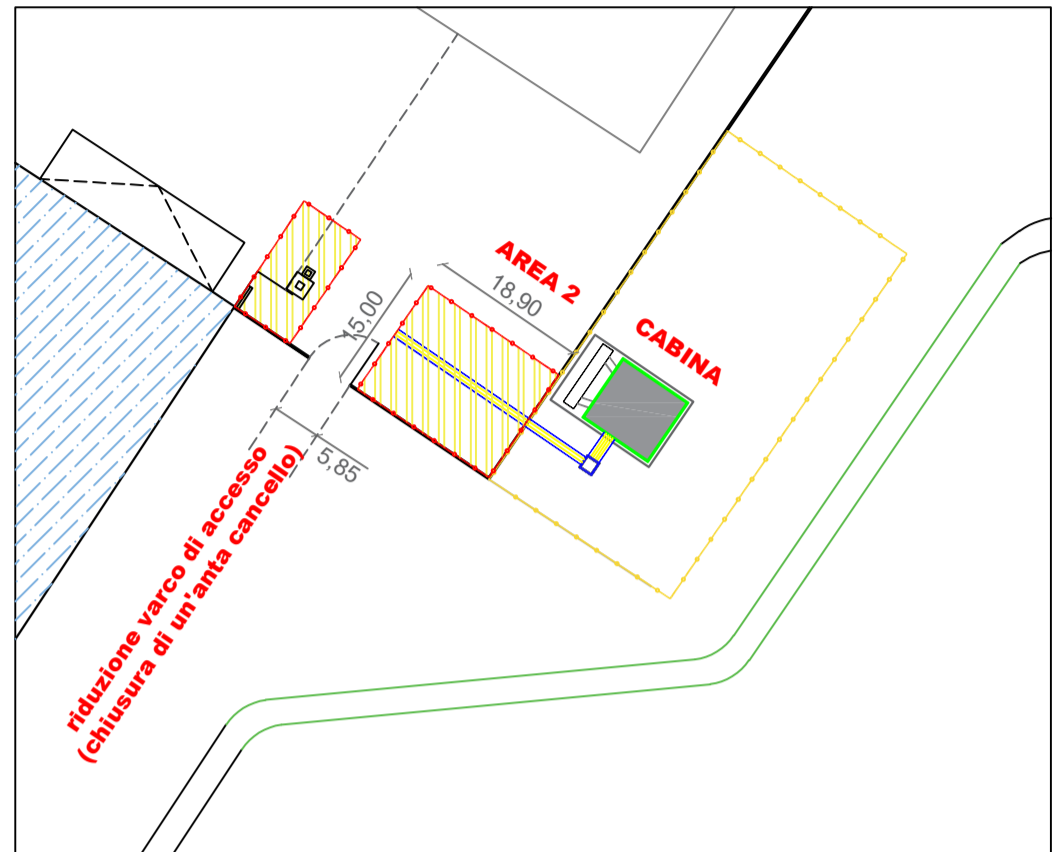


### LAVORAZIONI IN AREA 2:

- scavo
- posa cavidotti
- ripristino stratigrafia, ad eccezione del conglomerato bituminoso

**DURATA: 3GG**

## SOTTO FASE 3

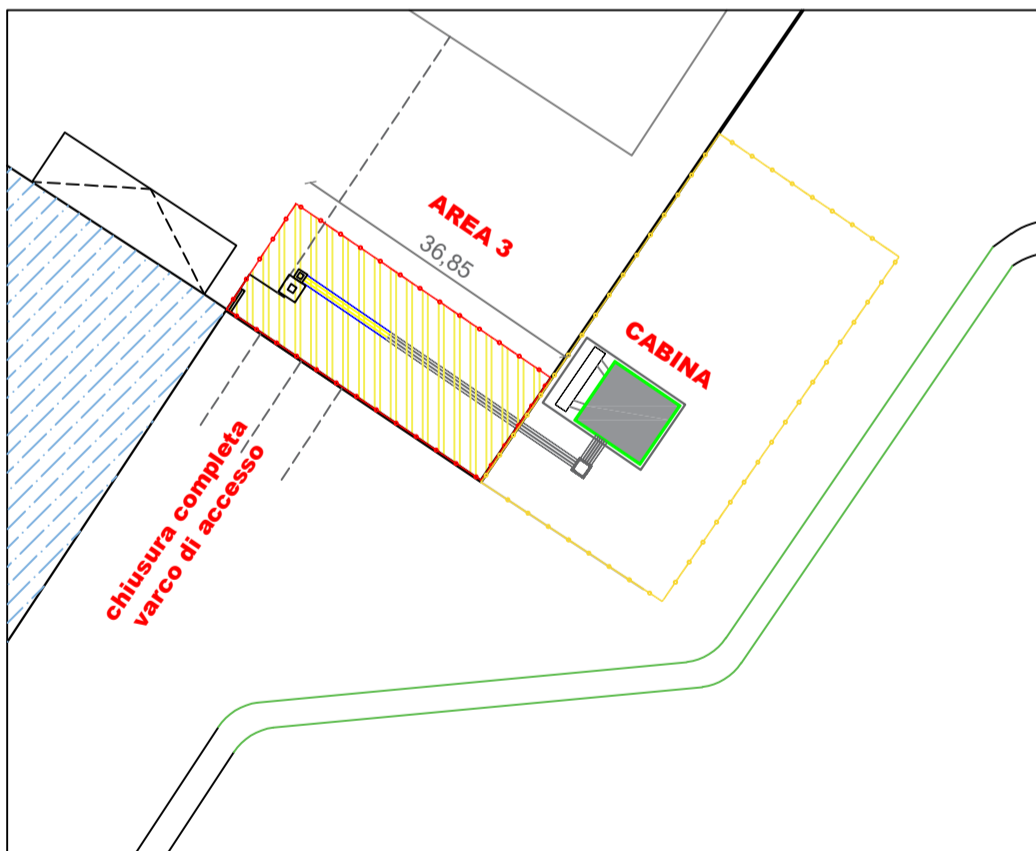


### LAVORAZIONI IN AREA 3:

- scavo in corrispondenza del varco di accesso
- posa cavidotti
- ripristino stratigrafia, compreso conglomerato bituminoso sull'intera area

**DURATA: 5GG**

## SOTTO FASE 4

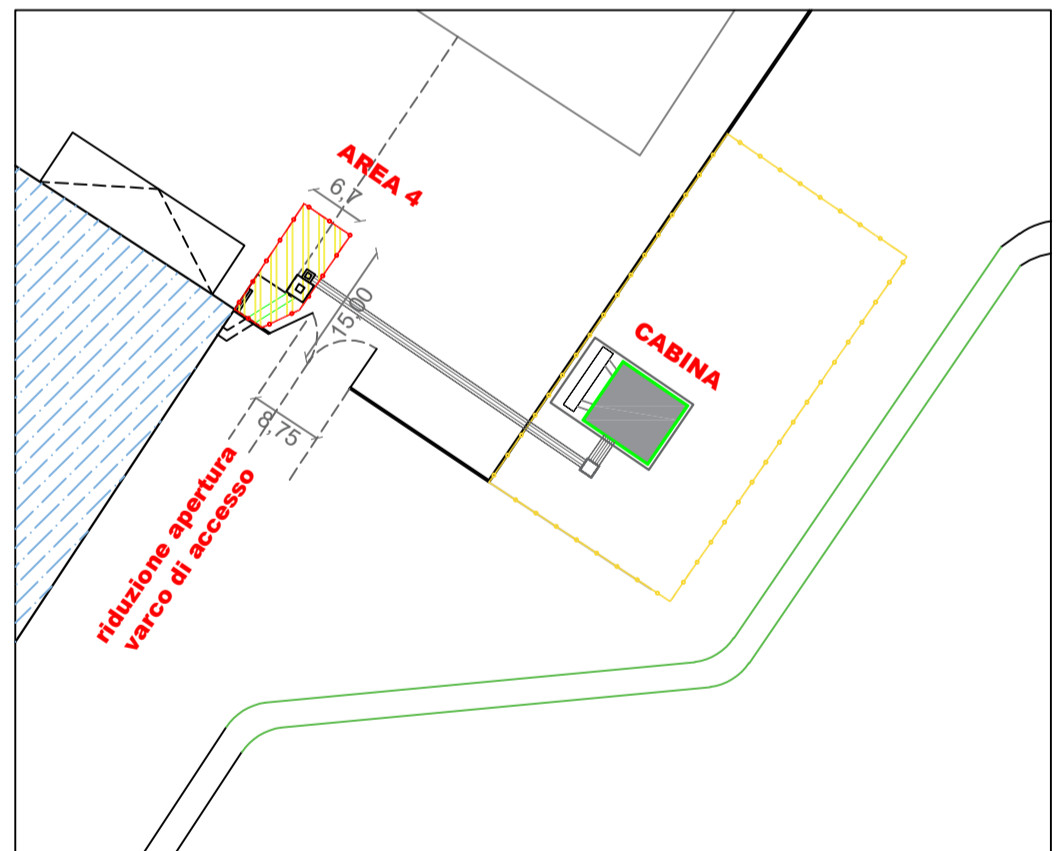

### LAVORAZIONI IN AREA 4:

- posa canale esterno per collegamento alla banchina
- posa pozzetto
- lavori di completamento

**DURATA: 3 GG**

### LEGENDA:

— Recinzione di cantiere

— Delimitazione aree per singole fasi

— Viabilità provvisoria in area MCT
